



Polícia Civil do Distrito Federal



**Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTIC
2017 – 2019**

2ª REVISÃO – Junho de 2019



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação CGTIC/PCDF

Presidente

Robson Cândido da Silva

Secretário Executivo

Saulo Ribeiro Lopes – DGI

Demais Membros

Benito Augusto Galiani Tiezzi – DGPC

Anderson Jorge Damasceno Espindola – CGP

Silvério Antônio Moita de Andrade – DAG

Guilherme Lorentz Blank – DEPATE

Victor Dan De Alencar Alves – DPE

Jeferson Lisboa Gimenez – DPC

Raimundo Cleverland A. Melo – DPT

Fernando Cesar Lima De Souza – DGP

Glaucia Cristina Da Silva – ESPC

Sérgio Henrique de Araújo Moraes – ASS/DGPC

Daniela Aquino Melo de Oliveira – AGE/DGPC

Representantes Técnicos

Charles Fernando Alves – DITEC/DGI

Oswaldo Gilson Victorino Silva – DITEL/DGI



Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
Janeiro/2017	1.0	Início dos trabalhos de revisão e atualização do PDTIC 2017 a 2019	Equipe de Elaboração do PDTIC, designada pela OS nº 01/2017 – CGTIC/PCDF
Janeiro/2017	1.0	Aprovação do Plano de Trabalho para a elaboração do PDTIC 2017 a 2019 em 30/01/2017	CGTIC/PCDF
Junho/2017	1.0	Finalização dos trabalhos de revisão e atualização do PDTIC 2017 a 2019	Equipe de Elaboração do PDTIC, designada pela OS nº 01/2017 – CGTIC/PCDF
Junho/2017	1.0	Aprovação do PDTIC 2017 a 2019 em 26/06/2017	CGTIC/PCDF
Julho/2018	1.1	Reunião para início dos trabalhos de Revisão do PDTIC 2017 a 2019	Equipe de Revisão do PDTIC
Agosto/2018	1.1	Reunião para apresentação das tabela de ações da Revisão do PDTIC 2017 a 2019 após os ajustes solicitados pelos Departamentos	Equipe de Revisão do PDTIC
Janeiro/2019	1.1	Aprovação da Revisão do PDTIC 2017 a 2019	CGTIC/PCDF
Mai/2019	1.2	Autorização e início da 2ª Revisão do PDTIC 2017 a 2019	CGTIC/PCDF e Secretaria Executiva do CGTIC/PCDF
Junho/2019	1.2	Aprovação da 2ª Revisão do PDTIC 2017 a 2019	CGTIC/PCDF



Índice

1. Introdução.....	5
2. Avaliação dos Resultados Alcançados nas Ações previstas no PDTIC 2017 a 2019	6
3. Plano de Metas e de Ações.....	13
4. Plano de Investimentos e Custeio	24
5. Proposta Orçamentária de TIC.....	28
6. Aprovação	29



1. Introdução

O presente documento teve como objetivo principal a inclusão de ações no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação –PDTIC/PCDF para o Triênio 2017 a 2019 que constam no Plano de Ação e das Metas contido no Relatório “Governo de Transição 2019-2022”, encaminhado via SEI por meio da Circular 18427329 (Processo 00052-00002540/2019-11) ao DGI/PCDF em 13 de fevereiro de 2019.

Tendo em vista que a 1ª revisão do PDTIC foi realizada em janeiro de 2019, para alinhamento ao Relatório acima referido, houve necessidade de incluir no PDTIC as ações de modernização do *Call Center* da PCDF, aquisição de Sistema Biométrico para acesso de servidores/visitantes e expansão do Sistema de Videomonitoramento nas Unidades Circunscricionais.


A seguir, são listadas, por seção, as alterações necessárias ao PDTIC 2017/2019 da PCDF. As seções não mencionadas permanecem inalteradas nessa segunda revisão.



2. Avaliação dos Resultados Alcançados nas Ações previstas no PDTIC 2017 a 2019

Após a 2ª Revisão do PDTIC 2017 a 2019 da PCDF, das 65 (sessenta e cinco) ações restantes, **26(40,00%)** estão em EXECUÇÃO, **17 (26,15%)** estão CONCLUÍDAS e encontram-se no DAG/PCDF aguardando a finalização do processo de contratação, **13 (20,00%)** estão com o Planejamento da Contratação EM ANDAMENTO e **09 (13,85%)** ainda NÃO foram INICIADAS.

Pela análise dos gráficos abaixo, verifica-se que houve um aumento do percentual de ações em execução e concluídas de **33 (52,38%)** na primeira revisão do PDTIC em 31/01/2019 para **43 (66,15%)** na segunda revisão no final de junho de 2019, o que demonstra o esforço das Unidades responsáveis para alcançar um bom nível de execução do PDTIC/PCDF 2017 a 2019.

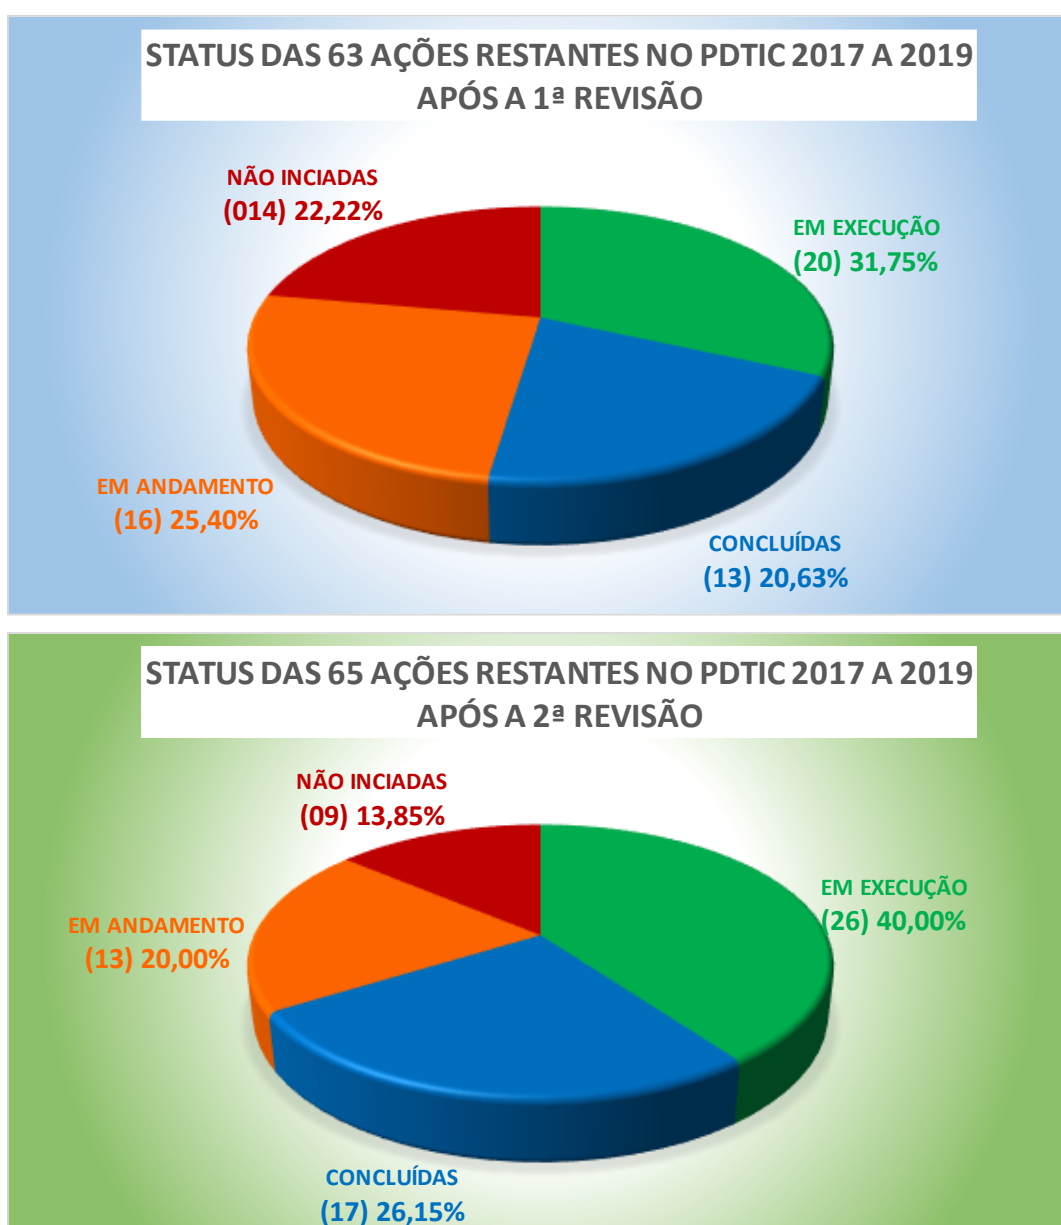

A seguir é apresentada a lista com o status das 65 ações remanescentes após a 2ª Revisão do PDTIC/PCDF 2017 a 2019 e suas respectivas situações:



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



STATUS ATUAL DAS 65 AÇÕES APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC

TOTAL DE AÇÕES (65 AÇÕES)				91.186.049,83	98.162.885,03	1.632.346,67	24.827.241,85	5.471.719,13	29.626.363,11	84.081.984,03	43.709.280,07
AÇÕES EM EXECUÇÃO (26 AÇÕES)				8.280.838,58	22.849.687,89	1.632.346,67	5.792.189,87	5.471.719,13	10.140.133,77	1.176.772,78	6.917.364,25
STATUS ATUAL DAS 65 AÇÕES APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC		Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento Total	Custeio Total	Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019
DITEC/DGI											
A1	Ampliação/atualização do Licenciamento da Solução de Backup/Restore	2017	2017	1.200.000,00	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
A2	Contratação de serviço de acesso à internet (links)	2017	2017	0,00	520.426,00	0,00	173.475,00	0,00	173.476,00	0,00	173.475,00
A3	Extensão da garantia, para 2.500 computadores da PCDF	2017	2017	0,00	668.325,00	0,00	668.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	Renovação de Garantia e Suporte técnico dos Servidores HP DL 980	2017	2017	0,00	374.693,88	0,00	124.897,96	0,00	124.897,96	0,00	124.897,96
A5	Solução antivírus	2017	2017	152.550,00	64.400,00	152.550,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	
A6	STORAGE - Subistemas de armazenamento de informações	2017	2018	4.385.048,06	0,00	0,00	0,00	4.385.048,06	0,00	0,00	0,00
A7	Fitas LTO6, com etiquetas, e Drive LTO5 para solução de Backup	2017	2017	147.796,67	0,00	147.796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A9	Renovação de Garantia e Suporte técnico da Solução Blade Cisco	2017	2019	0,00	250.176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.176,96
A10	Certificado Digital Padrão ICP-BRASIL para aplicação no sistema SITTEL	2017	2017	16.420,00	0,00	4.000,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	
A12	Certificado SSL do tipo WildCard para o Domínio da PCDF	2017	2017	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A15	Cofre para armazenamento e acondicionamento para fitas LT	2017	2017	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A22	Balanceador de links / aplicações (cluster)	2017	2018	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
A32	Reforma do site principal da PCDF	2018	2018	700.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
A63	Licenças VMware em sua versão mais atualizada	2018	2019	820.562,78	139.337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	820.562,78	139.337,22
A90	Extensão de garantia/suporte técnico de unidade robotica (t	2019	2019	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
DITEL/DGI											
A18	Serviços de Telefonia Móvel, local e longa Distância	2017	2017	0,00	5.501.054,00	0,00	1.815.854,00	0,00	1.842.600,00	0,00	1.842.600,00
DGI											
A17	Consultoria/atualização de licenças QlikView	2017	2018	0,00	5.130.230,03	0,00	1.578.866,79	0,00	1.775.681,62	0,00	1.775.681,62



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



STATUS ATUAL DAS 65 AÇÕES APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC

TOTAL DE AÇÕES (65 AÇÕES)				91.186.049,83	98.162.885,03	1.632.346,67	24.827.241,85	5.471.719,13	29.626.363,11	84.081.984,03	43.709.280,07	
AÇÕES EM EXECUÇÃO (26 AÇÕES)				8.280.838,58	22.849.687,89	1.632.346,67	5.792.189,87	5.471.719,13	10.140.133,77	1.176.772,78	6.917.364,25	
STATUS ATUAL DAS 65 AÇÕES APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC			Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento Total	Custeio Total	Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019
DIPO/DGI												
A19	Consultoria/atualização de licenças IBM i2		2017	2018	0,00	4.857.107,07	0,00	0,00	0,00	4.857.107,07	0,00	0,00
A34	Renovação de suporte técnico, Atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva do sistema GUARDIÃO		2018	2019	0,00	3.332.742,24	0,00	1.066.371,12	0,00	1.066.371,12	0,00	1.200.000,00
LABLD/DGI												
A65	Aquisição de SOFTWARE DELPHI XE 8		2018	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
A87	Aquisição de SOFTWARE DEVEXPRESS VCL (SUBSCRIPTION)		2019	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
DGP												
A40	Serviços de higienização, organização, classificação, digitalização, registro de metadados dos documentos que constituem as pastas funcionais dos servidores da PCDF		2018	2019	0,00	171.195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.195,49
IC/DPT												
A53	Soluções que permitam a extração de dados		2018	2019	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
A85	HD's, sendo 8 DRSATA 2TB, 12 DR NL-SAS 2TB e 16 DR SATA 4TB		2019	2018	28.623,07	0,00	0,00	0,00	28.623,07	0,00	0,00	0,00
A95	30 tablets e acessórios, para atender ao Criminal DROID		2018	2018	79.838,00	0,00	0,00	0,00	79.838,00	0,00	0,00	0,00
A96	118 dispositivos de armazenamento para atender necessidade de armazenamento de vídeo e imagem		2018	2018	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



STATUS ATUAL DAS 65 AÇÕES APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC

TOTAL DE AÇÕES (65 AÇÕES) 91.186.049,83 98.162.885,03 1.632.346,67 24.827.241,85 5.471.719,13 29.626.363,11 84.081.984,03 43.709.280,07

AÇÕES CONCLUÍDAS, PROCESSOS ENCAMINHADOS AO DAG (17 AÇÕES) 54.140.221,82 68.528.502,24 0,00 18.527.482,98 0,00 18.538.103,44 54.140.221,82 31.462.915,82

STATUS ATUAL DAS 65 AÇÕES APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC	Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento Total	Custeio Total	Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019
--	------------------	----------------	--------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

II/DPT

A8	Solução de Biometria Digital e emissão de documentos de identificação	2017	2019	23.856.691,52	12.147.244,23	0,00	4.672.200,00	0,00	4.654.820,46	23.856.691,52	2.820.223,77
----	---	------	------	---------------	---------------	------	--------------	------	--------------	---------------	--------------

DITEL/DGI

A14	Parte 1 - Suporte Técnico Especializado em Telefonia e Radiocomunicação	2017	2019	0,00	2.159.508,44	0,00	684.000,00	0,00	692.000,00	0,00	783.508,44
A36	Contratação de Serviços de Telefonia Fixa, local e longa Distância	2018	2019	0,00	3.520.000,00	0,00	500.000,00	0,00	520.000,00	0,00	2.500.000,00

DITEC/DGI

A11	Solução de impressão, cópia e digitalização a fim de atender necessidades gerais e específicas das unidades policiais da PCDF	2017	2019	0,00	9.036.906,11	0,00	2.146.708,75	0,00	2.146.708,75	0,00	4.743.488,61
A13	Serviços de suporte técnico e sustentação dos sistemas corporativos e ao ambiente tecnológico da PCDF	2017	2019	0,00	30.183.968,76	0,00	6.996.539,56	0,00	6.996.539,56	0,00	16.190.889,64
A20	Licenças de softwares de infraestrutura e desenvolvimento Microsoft	2017	2019	0,00	4.956.283,54	0,00	1.353.170,95	0,00	1.353.170,95	0,00	2.249.941,64
A24	Site (DATACENTER) de contingência da PCDF	2017	2019	7.262.048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262.048,61	0,00	0,00
A26	Maletas de ferramentas para manutenção preventiva e corretiva dos sistemas DITEC	2017	2019	8.168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,36	0,00	0,00
A42	Certificado Digital do Tipo A3 Token ou SmartCard com personalização para 5.800 servidores policiais	2018	2019	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
A48	Aquisição de Servidores de Rede para Rack para as Unidades da PCDF	2018	2019	2.624.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624.832,50	0,00	0,00
A55	Solução de Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança para Resposta a Incidentes de Segurança da Informação - SIEM	2018	2019	2.069.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.547,50	0,00	0,00
A64	Computadores do Tipo Workstation para unidades Técnicas	2018	2019	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
A71	Serviços de telecomunicações para rede metropolitana da PCDF, utilizando tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching)	2019	2019	0,00	4.424.591,16	0,00	1.474.863,72	0,00	1.474.863,72	0,00	1.474.863,72



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



STATUS ATUAL DAS 65 AÇÕES APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC

TOTAL DE AÇÕES (65 AÇÕES)	91.186.049,83	98.162.885,03	1.632.346,67	24.827.241,85	5.471.719,13	29.626.363,11	84.081.984,03	43.709.280,07
----------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

AÇÕES CONCLUÍDAS, PROCESSOS ENCAMINHADOS AO DAG (17 AÇÕES)	54.140.221,82	68.528.502,24	0,00	18.527.482,98	0,00	18.538.103,44	54.140.221,82	31.462.915,82
---	---------------	---------------	------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

STATUS ATUAL DAS 65 AÇÕES APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC		Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento Total	Custeio Total	Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019
A72	Servidores de Rede para Virtualização VMWare para o Datacenter da PCDF	2019	2019	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
A73	Estações de trabalho iMac de 21,5 polegadas "on site"	2019	2019	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
A76	Solução de Segurança da Informação para a Auditoria e Rastreabilidade no Ambiente de Domínio e Servidores de arquivo (Ferramenta de Auditoria)	2019	2019	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00
A78	Micro computadores para as unidades policiais	2019	2019	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00
A84	Solução de segurança de redes (Firewall, IPS, dentre outros)	2019	2019	0,00	2.100.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00

LABLD/DGI

A48	Servidores de Rede para o LABLD	2018	2019	169.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.933,33	0,00
-----	---------------------------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	------

IC/DPT

A97	Dois switches, oito computadores, dois servidores e trinta e dois HD's	2018	2019	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
-----	--	------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	------



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



STATUS ATUAL DAS 65 AÇÕES APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC

TOTAL DE AÇÕES (65 AÇÕES)	91.186.049,83	98.162.885,03	1.632.346,67	24.827.241,85	5.471.719,13	29.626.363,11	84.081.984,03	43.709.280,07
----------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

AÇÕES EM ANDAMENTO (13 AÇÕES)	15.964.989,43	2.859.694,90	0,00	205.569,00	0,00	646.125,90	15.964.989,43	2.008.000,00
--------------------------------------	---------------	--------------	------	------------	------	------------	---------------	--------------

STATUS ATUAL DAS 66 AÇÕES APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC	Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento Total	Custeio Total	Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019
--	------------------	----------------	--------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

IPDNA e CGCV/DPT

A21	Manutenção, atualização, treinamento e suporte do Sistema LIMS	2017	2019	0,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	56.000,00
-----	--	------	------	------	------------	------	------	------	------------	------	-----------

DICOE/DGI

A31	Serviço de modernização do call center para teleatendimento policial e sistema de denúncia	2018	2019	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
-----	--	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------------

DCCP/DEPATE

A45	Suporte e manutenção da Solução de Gestão de Presos - SPIS/SISPEN	2018	2019	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
-----	---	------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	--------------

DITEC/DGI

A37 e A54	Solução de Monitoramento de Performance de Aplicações (APM) e solução de gerenciamento de desempenho de rede e aplicações (NPM).	2018	2019	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
-----------	--	------	------	--------------	------	------	------	------	------	--------------	------

A47	Controlador de rede sem fio Wi-Fi para rede corporativa e de Pontos de Acesso de Rede, Access Point, Wi-Fi para as Unidades da Rede Corporativa da PCDF	2018	2019	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
-----	---	------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	------

A59	Acessórios para os switches (Transceivers óticos, cabo stack, GbIC)	2018	2019	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
-----	---	------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	------

A62	Aquisição de scanners, impressoras específicas e equipamentos de multimídia	2018	2019	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
-----	---	------	------	--------------	------	------	------	------	------	--------------	------

IML/DPT e Policlínica/DGP

A98	Solução em Tecnologia da Informação em saúde ocupacional, assistencial e pericial da Policlínica e IML/PCDF.	2019	2019	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
-----	--	------	------	--------------	------	------	------	------	------	--------------	------

DITEL/DGI

A14	Parte 2 - Contratação de Suporte Técnico Especializado Residente, com substituição de componentes e partes, para as Centrais Telefônicas (CPCT) Mitel/Aastra/MXOne da Polícia Civil do Distrito Federal.	2017	2019	670.000,00	783.694,90	0,00	205.569,00	0,00	226.125,90	670.000,00	352.000,00
-----	--	------	------	------------	------------	------	------------	------	------------	------------	------------

A16	Digitalização do Sistema de Rádio (Aquisição de Terminais e Serviços de Instalação e Capacitação)	2017	2019	6.809.973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809.973,08	0,00
-----	---	------	------	--------------	------	------	------	------	------	--------------	------

A16	Digitalização do Sistema de Rádio (Interface para interconexão das redes Analógica, Digital e outras)	2018	2019	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
-----	---	------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	------

A16	Digitalização do Sistema de Rádio (Aquisição de Repetidoras Híbridas)	2016	2019	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
-----	---	------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	------

A33	Parte 1 - Aquisição de equipamentos ... para telefonia IP do Sistema Telefônico da PCDF	2018	2019	585.016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.016,35	0,00
-----	---	------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	------



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



STATUS ATUAL DAS 65 AÇÕES APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC

TOTAL DE AÇÕES (65 AÇÕES)	91.186.049,83	98.162.885,03	1.632.346,67	24.827.241,85	5.471.719,13	29.626.363,11	84.081.984,03	43.709.280,07
----------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

AÇÕES NÃO INICIADAS (9 AÇÕES)	12.800.000,00	3.925.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00	12.800.000,00	3.321.000,00
--------------------------------------	---------------	--------------	------	------------	------	------------	---------------	--------------

STATUS ATUAL DAS 65 AÇÕES APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC	Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento Total	Custeio Total	Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019
--	------------------	----------------	--------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

DITEC/DGI

A39	Solução de Vídeo Wall para o centro de monitoramento do DGI/PCDF	2018	2019	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
A57	Treinamento em Banco de Dados SQL Server e Oracle	2018	2019	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
A70	Solução de Segurança composta por CFTV e biometria para controle de acesso às instalações das Unidades da PCDF	2019	2019	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00

ESPC

A82	Software de gestão acadêmica, contratação de serviços de consultoria	2019	2019	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
-----	--	------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	--------------

IC/DPT e DAE/DAG

A35	Softwares especialista para desenvolvimento, editoração, projetos, entre outros	2018	2019	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
-----	---	------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	------

IC/DPT

A46	Solução/ plataforma integrada única para automação de laudos e relatórios periciais, da gestão de informações laboratoriais entre outras informações e da garantia de cadeia de custódia para os institutos da Polícia Técnica e demais unidades da PCDF no controle de vestígios.	2018	2019	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
-----	--	------	------	--------------	------	------	------	------	------	--------------	------

DITEL/DGI

A16	Digitalização do Sistema de Rádio (Aquisição de Infraestrutura Complementar Tetra e sistema de Despacho e Controle)	2017	2019	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
A28	Aquisição de insumos para manutenção básica em rádio e telefonia	2017	2019	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00

DRM/DAG

A88	Suporte Técnico com atualização de licenças e Help Desk de forma continuada para o Sistema ASI	2019	2019	0,00	900.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
-----	--	------	------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

ASS/DGPC

A89	Licenças do software Folio Workbench Builder e licença do software Folio Views	2019	2019	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
-----	--	------	------	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



3. Plano de Metas e de Ações

A 2ª Revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação –PDTIC/PCDF para o Triênio 2017 a 2019 fez-se necessária para alinhamento da 1ª revisão realizada em janeiro de 2019 ao Relatório “Governo de Transição 2019-2022”, onde três ações foram incluídas e uma ação foi transferida para o próximo PDTIC, tendo como resultado um Plano de Metas e Ações atualizado, conforme tabelas abaixo:

AÇÕES INCLUÍDAS NA SEGUNDA REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 a 2019								
ID	Departamento	Responsável	Ação	Qtd	Investimento Total	Custeio Total	Previsão Inicial	Motivo da Inclusão
A31	DGI	DICOE	Contratação de empresa para prestação de serviço de modernização do call center para teleatendimento policial e sistema de denúncia	1	R\$ -	R\$ 400.000,00	2018	INCLUÍDAS para alinhamento ao Plano de Ação e das Metas contido no Relatório “Governo de Transição 2019-2022”, encaminhado via SEI por meio da Circular 18427329 (Processo 00052-00002540/2019-11) ao DGI/PCDF em 13 de fevereiro de 2019
A39	DGI	DITEC	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Solução de Vídeo Wall para 02 (duas) salas do centro de monitoramento do DGI/PCDF	1	R\$ 1.350.000,00	R\$ -	2018	
A70	DGI	DITEC	Solução de Segurança composta por CFTV e biometria para controle de acesso às instalações das Unidades da PCDF	1	R\$ 7.000.000,00	R\$ -	2019	

AÇÕES TRANSFERIDAS PARA O PRÓXIMO PDTIC NA SEGUNDA REVISÃO DO PDTIC 2017 a 2019								
ID	Departamento	Responsável	Ação	Qtd	Previsão Investimento Total	Previsão Custeio Total	Previsão Inicial	Motivo da Transferência
A83	DPE	DECRIN	Aquisição de soluções que viabilizem a coleta de informações de vítimas com deficiência física, auditiva e/ou visual (software ampliador de tela, de correio braile, de conversor de texto, voz e imagem para libras, de sintetizador de voz, de tradutor braile, impressora em braile, máquinas para oitiva, dicionário libras, etc)	1	R\$ 80.700,00	R\$ -	2019	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



1) PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO

Após a 2ª revisão do PDTIC/PCDF 2017 a 2019, o Plano de Metas e Ações passou a conter 65 ações.

PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019																
Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
								G	U	T	TOTAL GUT			Investimento Total	Custeio Total	
1	A1	DGI	DITEC	N1	Contratação de empresa especializada para fornecimento de ampliação/atualização do Licenciamento da Solução de Backup/Restore, Desduplicação de dados, com garantia, transferência de conhecimento, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, por no mínimo 12 (doze) meses	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	5	5	5	125	dez-17	dez-17	R\$ 1.200.000,00	R\$ 900.000,00	EXECUÇÃO
	A2	DGI	DITEC	N9	Contratação de serviço de acesso à internet (links)	Aprimorar a Estrutura de Rede de Dados da PCDF	Índice de disponibilidade dos Serviços de Rede da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	5	5	5	125	dez-17	dez-17	R\$ -	R\$ 520.426,00	EXECUÇÃO
	A3	DGI	DITEC	N3	Serviço de manutenção corretiva, com aplicação de peças, extensão da garantia, para 2.500 computadores da PCDF.	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	5	5	125	dez-17	dez-17	R\$ -	R\$ 668.325,00	EXECUÇÃO
	A4	DGI	DITEC	N3	Renovação de Garantia e Suporte técnico dos Servidores HP DL 980, por 36 meses.	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	5	5	125	dez-17	dez-17	R\$ -	R\$ 374.693,88	EXECUÇÃO
	A5	DGI	DITEC	N12	Contratação de empresa para fornecimento de solução antivírus, com licenciamento perpétuo, válido e atualizado por 36 meses, gerência centralizada, suporte técnico on site e capacitação.	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança de rede tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança de rede	5	5	5	125	dez-17	dez-17	R\$ 152.550,00	R\$ 64.400,00	EXECUÇÃO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
								G	U	T	TOTAL GUT			Investimento Total	Custeio Total	
1	A7	DGI	DITEC	N1	Contratação de empresa para fornecimento de fitas LTO6, com etiquetas, e Drive LTO5 para solução de Backup	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	5	5	5	125	dez-17	dez-17	R\$ 147.796,67	R\$ -	EXECUÇÃO
	A10	DGI	DITEC	N12	Aquisição de Certificado Digital Padrão ICP-BRASIL para aplicação no sistema SITTEL	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança de rede tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança de rede	5	5	5	125	dez-17	dez-17	R\$ 16.420,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A12	DGI	DITEC	N12	Aquisição de Certificado SSL do tipo WildCard para o Domínio da PCDF, com validade de 36 meses.	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança de rede tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança de rede	5	5	5	125	dez-17	dez-17	R\$ 8.000,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A15	DGI	DITEC	N1	Aquisição de cofre para armazenamento e acondicionamento para fitas LTO	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	5	5	5	125	dez-17	dez-17	R\$ 120.000,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A18	DGI	DITEL	N5	Contratação de Serviços de Telefonia Móvel, local e longa Distância.	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	5	5	5	125	dez-17	dez-17	R\$ -	R\$ 5.501.054,00	EXECUÇÃO
	A6	DGI	DITEC	N2	Contratação de empresa especializada no fornecimento de 02 (dois) subsistemas de armazenamento de informações com capacidade para armazenar até 800 (oitocentos) terabytes em Alta Disponibilidade Ativo-Ativo, com Transferência de conhecimento, suporte técnico e manutenções por 60 (sessenta) meses.	Aprimorar a infraestrutura de TIC, otimizando a capacidade, integridade, disponibilidade e estrutura de armazenamento de dados	Índice de disponibilidade dos equipamentos	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ 4.385.048,06	R\$ -	EXECUÇÃO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019																
Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
								G	U	T	TOTAL GUT			Investimento Total	Custeio Total	
1	A8	DPT	I.I.	N4	Desenvolver projeto para Contratação de Empresa para prestação de serviços de suporte técnico, Atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva da Solução de Biometria Digital e emissão de documentos de identificação	Modernizar o controle, armazenamento de dados, pesquisa e a emissão dos documentos de identificação	Índice de emissão de documentos; % de atendimento de pesquisas de dados biométricos e forenses	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ 23.856.691,52	R\$ 12.147.244,23	CONCLUÍDO
	A9	DGI	DITEC	N3	Renovação de Garantia e Suporte técnico da Solução Blade Cisco (Chassi, lâminas e switches de ligação)	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ -	R\$ 250.176,96	EXECUÇÃO
	A11	DGI	DITEC	N3	Contratação de solução de impressão, cópia e digitalização a fim de atender necessidades gerais e específicas das unidades policiais da PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ -	R\$ 9.036.906,11	CONCLUÍDO
	A13	DGI	DITEC	N6	Contratação de empresa para provimento de Mão de Obra técnica especializada para prestação de serviços de suporte técnico e sustentação dos sistemas corporativos e ao ambiente tecnológico da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF	Firmar contratos de acordo com a estratégia para terceirização de serviços de TIC	Índice de atendimento dos serviços prestados que atenda o ANS – Acordo de Nível de Serviço (SLA) contratado	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ -	R\$ 30.183.968,76	CONCLUÍDO
	A14	DGI	DITEL	N6	Contratação de Suporte Técnico Especializado em Telefonia e Radiocomunicação & contratação de Suporte Técnico Especializado Residente, com substituição de componentes e partes, para as Centrais Telefônicas (CPCT) Mitel/Aastra/MX-One da Polícia Civil do Distrito Federal.	Firmar contratos de acordo com a estratégia para terceirização de serviços de TIC	Índice de atendimento dos serviços prestados que atenda o ANS – Acordo de Nível de Serviço (SLA) contratado	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ 670.000,00	R\$ 2.943.203,34	ANDAMENTO
	A16	DGI	DITEL	N5	Modernização do parque tecnológico de radiocomunicação: digitalização do Sistema de Rádio (Aquisição de Infraestrutura e equipamentos Tetra e de Repetidoras Híbridas)	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ 8.329.973,08	R\$ -	ANDAMENTO
	A17	DGI	DGI	N13	Renovação da prestação de serviços técnicos especializados, modalidade conhecida como on site, através da alocação de profissionais dentro do ambiente da PCDF e ampliação/atualização de licenças QlikView	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ -	R\$ 5.130.230,03	EXECUÇÃO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019																
Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
								G	U	T	TOTAL GUT			Investimento Total	Custeio Total	
1	A19	DGI	DIPO	N13	Contratação de empresa especializada para atualização de licenças IBM i2, destinadas à modernização de Ferramenta de Análise de Inteligência Policial, prestação de serviços de suporte técnico para a implementação e operação da solução e serviços de treinamento na última versão disponibilizada pelo fabricante, treinamento e prestação de serviços especializados para continuidade, reestruturação e potencialização do “Sistema Cérebro” da PCDF	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ -	R\$ 4.857.107,07	EXECUÇÃO
	A20	DGI	DITEC	N3	Aquisição de licenças de softwares de infraestrutura e desenvolvimento Microsoft	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ -	R\$ 4.956.283,54	CONCLUÍDO
	A21	DPT	IPDNA/CGCV	N8	Renovação do contrato de manutenção, atualização, treinamento e suporte do Sistema de Administração de Informações Laboratoriais, LIMS	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	5	5	5	125	dez-17	dez-19	R\$ -	R\$ 476.000,00	ANDAMENTO
	A22	DGI	DITEC	N1	Aquisição de balanceador de links / aplicações (cluster)	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ 370.000,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A24	DGI	DITEC	N13	Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de ambiente de alta disponibilidade e segurança para o CPD do site de contingência da PCDF	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ 7.262.048,61	R\$ -	CONCLUÍDO
	A32	DGI	DITEC	N3	Contratação de empresa especializada para Prestação de serviço de disponibilização de ambiente de alta disponibilidade e segurança para o CPD do site principal da PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	5	5	125	dez-18	dez-19	R\$ 700.000,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A55	DGI	DITEC	N12	Aquisição de Solução de Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança para Resposta a Incidentes de Segurança da Informação - SIEM (Security Information and Event Management)	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança de rede tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança de rede	5	5	4	100	dez-18	dez-19	R\$ 2.069.547,50	R\$ -	CONCLUÍDO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019																
Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
								G	U	T	TOTAL GUT			Investimento Total	Custeio Total	
1	A63	DGI	DITEC	N3	Aquisição de licenças VMware em sua versão mais atualizada à época de contratação	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	5	4	100	dez-18	dez-19	R\$ 820.562,78	R\$ 139.337,22	EXECUÇÃO
2	A31	DGI	DICOE	N8	Contratação de empresa para prestação de serviço de modernização do call center para teleatendimento policial e sistema de denúncia	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	5	4	4	80	dez-18	dez-19	R\$ -	R\$ 400.000,00	ANDAMENTO
	A33	DGI	DITEL	N5	Aquisição de equipamentos para telefonia IP do Sistema Telefônico Mitel/Aastra/MX-One (versão 5.0) da Polícia Civil do Distrito Federal	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	5	4	4	80	dez-18	dez-19	R\$ 585.016,35	R\$ -	ANDAMENTO
	A34	DGI	DIPO	N7	Renovação de suporte técnico, Atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva do sistema GUARDIÃO	Garantir o funcionamento da Solução de Interceptação e Monitoramento Telefônico de modo que atenda os requisitos de DISPONIBILIDADE; INTEGRIDADE; CONFIDENCIALIDADE e AUTENTICIDADE aos usuários da PCDF	ANS – Acordo de Nível de Serviço (SLA) contratado para a Solução de Interceptação e Monitoramento Telefônicos	5	4	4	80	dez-18	dez-19	R\$ -	R\$ 3.332.742,24	EXECUÇÃO
	A35	DPT/DAG	DPT/DAG	N8	Aquisição de softwares especialista para desenvolvimento, editoração, projetos, entre outros	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	5	4	4	80	dez-18	dez-19	R\$ 750.000,00	R\$ -	NÃO INICIADO
	A36	DGI	DITEL	N5	Contratação de Serviços de Telefonia Fixa, local e longa Distância	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	5	4	4	80	dez-18	dez-19	R\$ -	R\$ 3.520.000,00	CONCLUÍDO
	A37	DGI	DITEC	N1	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Solução de Monitoramento de Performance de Aplicações (APM), com transferência de conhecimento, suporte técnico, e manutenções por no mínimo 36 (trinta e seis) meses	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	5	4	4	80	dez-18	dez-19	R\$ 400.000,00	R\$ -	ANDAMENTO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019																
Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
								G	U	T	TOTAL GUT			Investimento Total	Custeio Total	
2	A39	DGI	DITEC	N13	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Solução de Vídeo Wall para 02 (duas) salas do centro de monitoramento do DGI/ PCDF	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	5	4	4	80	dez-18	dez-19	R\$ 1.350.000,00	R\$ -	NÃO INICIADO
	A45	DEPATE	DCCP	N8	Contratação de Empresa especializada no Suporte e manutenção da Solução de Gestão de Presos - SPIS/SISPEN	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	5	4	4	80	dez-18	dez-19	R\$ -	R\$ 1.200.000,00	ANDAMENTO
	A48	DGI	DITEC	N3	Aquisição de Servidores de Rede para Rack para as Unidades da PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	4	4	80	dez-18	dez-19	R\$ 2.794.765,83	R\$ -	CONCLUÍDO
	A53	DPT	IC	N8	Aquisição de soluções que permitam a extração de dados para aplicação em diversas áreas, tais como, telefonia, informática, veicular, para posterior análise forense e ser utilizada como meio probatório	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de diponibilidade dos sistemas	5	4	4	80	dez-18	dez-19	R\$ -	R\$ 800.000,00	EXECUÇÃO
	A54	DGI	DITEC	N1	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de gerenciamento de desempenho de rede e aplicações, o Network Performance Monitor (NPM) da Rede Corporativa da PCDF, com transferência de conhecimento, suporte técnico, e manutenções por no mínimo 36 (trinta e seis) meses	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	5	4	4	80	dez-18	dez-19	R\$ 900.000,00	R\$ -	ANDAMENTO
	A62	DGI	DITEC	N3	Aquisição de scanners, impressoras específicas e equipamentos de multimídia	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	5	4	80	dez-18	dez-19	R\$ 1.500.000,00		ANDAMENTO
	A78	DGI	DITEC	N3	Aquisição de Micro computadores para as unidades policiais, modelo desktop, processador CORE I7 - 6700K 3,6 Ghz, memória RAM 8 GB DDR4, placa de vídeo 1Gb, teclado, mouse ótico, hd 1 tera, 2 monitores 23", fonte bivolt	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	5	4	80	dez-19	dez-19	R\$ 9.500.000,00	R\$ -	CONCLUÍDO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019																
Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
								G	U	T	TOTAL GUT			Investimento Total	Custeio Total	
2	A84	DGI	DITEC	N3	Contratação de empresa especializada na solução de segurança de redes (Firewall, IPS, dentre outros), Serviços de garantia e atualização de licenças e de suporte técnico com manutenção preventiva para produtos Fortinet	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	4	5	80	dez-19	dez-19	R\$ -	R\$ 2.100.000,00	CONCLUÍDO
	A26	DGI	DITEC	N3	Aquisição de maletas de ferramentas para manutenção preventiva e corretiva própria dos sistemas DITEC	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	5	4	80	dez-17	dez-19	R\$ 8.168,36	R\$ -	CONCLUÍDO
	A64	DGI	DITEC	N3	Aquisição de computadores do Tipo Workstation para unidades Técnicas	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	4	4	64	dez-18	dez-19	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	CONCLUÍDO
	A65	DGI	LABLD	N8	Aquisição de SOFTWARE DELPHI XE 8	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	4	4	4	64	dez-18	dez-18	R\$ 20.000,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A70	DGI	DITEC	N12	Solução de Segurança composta por CFTV e biometria para controle de acesso às instalações das Unidades da PCDF	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança de rede tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança de rede	4	4	4	64	dez-19	dez-19	R\$ 7.000.000,00	R\$ -	NÃO INICIADO
	A72	DGI	DITEC	N3	Aquisição de Servidores de Rede para Virtualização VMWare para o Datacenter da DITEC/PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	4	4	64	dez-19	dez-19	R\$ 1.600.000,00	R\$ -	CONCLUÍDO
	A73	DGI	DITEC	N3	Aquisição de estações de trabalho iMac de 21,5 polegadas "on site"	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	4	4	64	dez-19	dez-19	R\$ 520.000,00	R\$ -	CONCLUÍDO
	A76	DGI	DITEC	N12	Aquisição de Solução de Segurança da Informação para a Auditoria e Rastreabilidade no Ambiente de Domínio e Servidores de arquivo	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança de rede tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança de rede	4	4	4	64	dez-19	dez-19	R\$ 925.000,00	R\$ -	CONCLUÍDO
	A85	DPT	IC	N3	Aquisição de HD's, sendo 8 DRSATA 2TB, 12 DR NL-SAS 2TB e 16 DR SATA 4TB	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	4	4	64	dez-19	dez-18	R\$ 28.623,07	R\$ -	EXECUÇÃO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019																
Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
								G	U	T	TOTAL GUT			Investimento Total	Custeio Total	
2	A87	DGI	LABLD	N8	Aquisição de SOFTWARE DEVEXPRESS VCL (SUBSCRIPTION)	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	4	4	4	64	dez-19	dez-18	R\$ 8.000,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A95	DPT	IC	N1	Aquisição de 30 tablets e acessórios, para atender ao Criminal DROID	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	4	4	4	64	dez-18	dez-18	R\$ 79.838,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A96	DPT	IC	N2	Aquisição de 118 dispositivos de armazenamento para atender necessidade de armazenamento de vídeo e imagem	Aprimorar a infraestrutura de TIC, otimizando a capacidade, integridade, disponibilidade e estrutura de armazenamento de dados	Índice de disponibilidade dos equipamentos	4	4	4	64	dez-18	dez-18	R\$ 224.000,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A97	DPT	IC	N1	Aquisição de dois switches, oito computadores, dois servidores e trinta e dois HD's	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	4	4	4	64	dez-18	dez-19	R\$ 104.000,00	R\$ -	CONCLUÍDO
3	A40	DGP	DGP	N8	Contratação de empresa para prestação dos serviços de higienização, organização, classificação, digitalização, registro de metadados dos documentos que constituem as pastas funcionais dos servidores da PCDF com transferência de tecnologia e o fornecimento, mediante sistema de registro de preços, de equipamentos para digitalização - scanners e monitores de vídeo, incluindo a prestação de garantia on site dos equipamentos pelo período de 36 (trinta e seis) meses, nas condições estabelecidas no instrumento convocatório	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de diponibilidade dos sistemas	4	4	3	48	dez-18	dez-19	R\$ -	R\$ 171.195,49	EXECUÇÃO
	A42	DGI	DITEC	N12	Aquisição de Certificado Digital do Tipo A3 Token ou SmartCard com personalização para 5.800 servidores policiais	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança de rede tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança de rede	3	4	4	48	dez-18	dez-19	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	CONCLUÍDO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019																
Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
								G	U	T	TOTAL GUT			Investimento Total	Custeio Total	
3	A98	DPT/DGP	IML/Policlínica	N8	Aquisição de solução em Tecnologia da Informação em saúde ocupacional, assistencial e pericial da Policlínica e IML/PCDF.	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de diponibilidade dos sistemas	4	4	3	48	dez-19	dez-19	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	ANDAMENTO
	A46	DPT	IC	N8	Solução/ plataforma integrada única para automação de laudos e relatórios periciais, da gestão de informações laboratoriais, de dados científicos, dos procedimentos técnicos, dos equipamentos analíticos, do controle de estoque de consumíveis e da garantia de cadeia de custódia para os institutos da Polícia Técnica (Instituto de Criminalística, Instituto de Medicina Legal, Instituto de Identificação, Instituto de Pesquisa de DNA Forense e Central de Guarda e Custódia de Vestígios) e demais unidades da PCDF no controle de vestígios.	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de diponibilidade dos sistemas	4	4	3	48	dez-18	dez-19	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	NÃO INICIADO
	A28	DGI	DITEL	N5	Aquisição de insumos para manutenção básica em rádio e telefonia	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	3	3	4	36	dez-17	dez-19	R\$ -	R\$ 54.000,00	NÃO INICIADO
	A57	DGI	DITEC	N11	Contratação de empresa para treinamento em Banco de Dados SQL Server e Oracle	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	3	3	4	36	dez-18	dez-19	R\$ -	R\$ 165.000,00	NÃO INICIADO
	A59	DGI	DITEC	N3	Aquisição de acessórios para os switches (Transceivers óticos, cabo stack, GbIC)	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	3	3	4	36	dez-18	dez-19	R\$ 700.000,00	R\$ -	ANDAMENTO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
								G	U	T	TOTAL GUT			Investimento Total	Custeio Total	
4	A82	APC	DITEC	N8	Aquisição de software de gestão acadêmica, contratação de serviços de consultoria, incluindo a transferência de tecnologia	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	3	3	3	27	dez-19	dez-19	R\$ -	R\$ 2.800.000,00	NÃO INICIADO
	A88	DAG	DRM	N16	Renovação de Contratação de empresa especializada para executar serviços de Manutenções Preventiva e Corretiva, Evolutiva e Adaptativa sob demanda, Suporte Técnico com atualização de licenças e Help Desk de forma continuada para o Sistema Integrado de Gestão Automation System Inventory – ASI, contemplando os módulos de Almoxarifado, Patrimônio, Compras e Contratos	Implementar ou recursos que auxiliam a gestão patrimonial da PCDF	Percentual implementado de ações e projetos que agreguem valor à Gestão Patrimonial da PCDF	3	3	3	27	dez-19	dez-19	R\$ -	R\$ 900.000,00	NÃO INICIADO
	A89	DGPC	DGPC	N8	Contratação de empresa para fornecimento licenças do software Folio Workbench Builder e licença do software Folio Views, incluindo atualização de licença, com garantia, suporte técnico e upgrade por 48 (quarenta e oito) meses	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	3	3	3	27	dez-19	dez-19	R\$ -	R\$ 6.000,00	NÃO INICIADO
	A90	DGI	DITEC	N1	Contratação de empresa para prestação de serviço de extensão de garantia/suporte técnico de unidade robótica (tape drive) com seis drives LTO 6.	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	3	3	3	27	dez-19	dez-19	R\$ -	R\$ 140.000,00	EXECUÇÃO
	A47	DGI	DITEC	N3	Aquisição de Controlador de rede sem fio Wi-Fi para rede corporativa e de Pontos de Acesso de Rede, Access Point, Wi-Fi para as Unidades da Rede Corporativa da PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	3	3	2	18	dez-18	dez-19	R\$ 580.000,00	R\$ -	ANDAMENTO
	A71	DGI	DITEC	N9	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de telecomunicações para rede metropolitana da PCDF, utilizando tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching)	Aprimorar a Estrutura de Rede de Dados da PCDF	Índice de disponibilidade dos Serviços de Rede da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	2	3	3	18	dez-19	dez-19	R\$ -	R\$ 4.424.591,16	CONCLUÍDO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



4. Plano de Investimentos e Custeio

Foi realizada a atualização do Plano de Investimentos e Custeio após a 2ª Revisão do PDTIC/PCDF 2017 a 2019, para acrescentar a este Plano os valores referentes às ações incluídas no Plano de Metas e Ações do PDTIC, conforme tabela a seguir:

PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO ATUALIZADO APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Id	Tipo de Necessidade	Descrição da Necessidade	Estimativas de gastos (em R\$)					
			Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019
N1	Infraestrutura	Garantir a continuidade do negócio	R\$ 1.467.796,67	R\$ 300.000,00	R\$ 449.838,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.404.000,00	R\$ 440.000,00
N2	Infraestrutura	Ampliação e modernização de armazenamento de dados/informações	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.609.048,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -
N3	Infraestrutura	Modernização, ampliação, atualização, adequação, padronização e disponibilidade do parque tecnológico	R\$ -	R\$ 4.993.102,66	R\$ 378.623,07	R\$ 4.324.777,66	R\$ 21.373.496,97	R\$ 8.207.842,39
N5	Infraestrutura	Modernização, ampliação, atualização, adequação, manutenção e padronização de Sistemas de Telecomunicações	R\$ -	R\$ 2.315.854,00	R\$ -	R\$ 2.362.600,00	R\$ 8.914.989,43	R\$ 4.396.600,00
N9	Infraestrutura	Modernização, ampliação, atualização, adequação e padronização do serviço de Rede de Longa Distância WAN, de Rede Local LAN e Rede Local sem fio (Wireless) - WLAN	R\$ -	R\$ 1.648.338,72	R\$ -	R\$ 1.648.339,72	R\$ -	R\$ 1.648.338,72
N12	Infraestrutura	Aprimoramento da gestão da política de segurança da informação	R\$ 164.550,00	R\$ 64.400,00	R\$ 6.210,00	R\$ -	R\$ 12.500.757,50	R\$ -



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO ATUALIZADO APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Id	Tipo de Necessidade	Descrição da Necessidade	Estimativas de gastos (em R\$)					
			Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019
N4	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Aquisição, ampliação, manutenção e sustentação da solução de biometria digital e emissão de documentos de identificação	R\$ -	R\$ 4.672.200,00	R\$ -	R\$ 4.654.820,46	R\$ 23.856.691,52	R\$ 2.820.223,77
N7	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Ampliação, manutenção e sustentação da solução de prestação de serviço de interceptação e monitoramento telefônicos	R\$ -	R\$ 1.066.371,12	R\$ -	R\$ 1.066.371,12	R\$ -	R\$ 1.200.000,00
N8	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Manutenção, sustentação, desenvolvimento, integração, implementação e documentação dos sistemas utilizados na PCDF	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 422.000,00	R\$ 6.750.000,00	R\$ 5.429.195,49
N13	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Ampliação, manutenção e sustentação de soluções relacionadas a processos de investigação e de gestão da informação institucional	R\$ -	R\$ 1.578.866,79	R\$ -	R\$ 6.632.788,69	R\$ 8.612.048,61	R\$ 1.775.681,62
N16	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Aprimoramento da gestão patrimonial na PCDF	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ 300.000,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO ATUALIZADO APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019


Id	Tipo de Necessidade	Descrição da Necessidade	Estimativas de gastos (em R\$)					
			Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019
N4	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Aquisição, ampliação, manutenção e sustentação da solução de biometria digital e emissão de documentos de identificação	R\$ -	R\$ 4.672.200,00	R\$ -	R\$ 4.654.820,46	R\$ 23.856.691,52	R\$ 2.820.223,77
N11	Capacitação	Promoção de forma efetiva da Capacitação em TIC no âmbito da PCDF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 165.000,00
N6	Mão de Obra		R\$ -	R\$ 7.886.108,56	R\$ -	R\$ 7.914.665,46	R\$ 670.000,00	R\$ 17.326.398,08
TOTAL			R\$ 1.632.346,67	R\$ 24.827.241,85	R\$ 5.471.719,13	R\$ 29.626.363,11	R\$ 84.081.984,03	R\$ 43.709.280,07
TOTAL GERAL								R\$ 189.348.934,86



QUADRO RESUMO

Tipo de Necessidade	Ano	Recursos Orçamentários	
		Investimento	Custeio
Infraestrutura	2017	R\$ 1.632.346,67	R\$ 9.321.695,38
	2018	R\$ 5.443.719,13	R\$ 8.635.717,38
	2019	R\$ 44.193.243,90	R\$ 14.692.781,11
Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	2017	R\$ -	R\$ 7.619.437,91
	2018	R\$ 28.000,00	R\$ 13.075.980,27
	2019	R\$ 39.218.740,13	R\$ 11.525.100,88
Capacitação	2017	R\$ -	R\$ -
	2018	R\$ -	R\$ -
	2019	R\$ -	R\$ 165.000,00
Mão de Obra	2017	R\$ -	R\$ 7.886.108,56
	2018	R\$ -	R\$ 7.914.665,46
	2019	R\$ 670.000,00	R\$ 17.326.398,08
TOTAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS			R\$ 189.348.934,86

Recursos Orçamentários por Área (2017 - 2019)

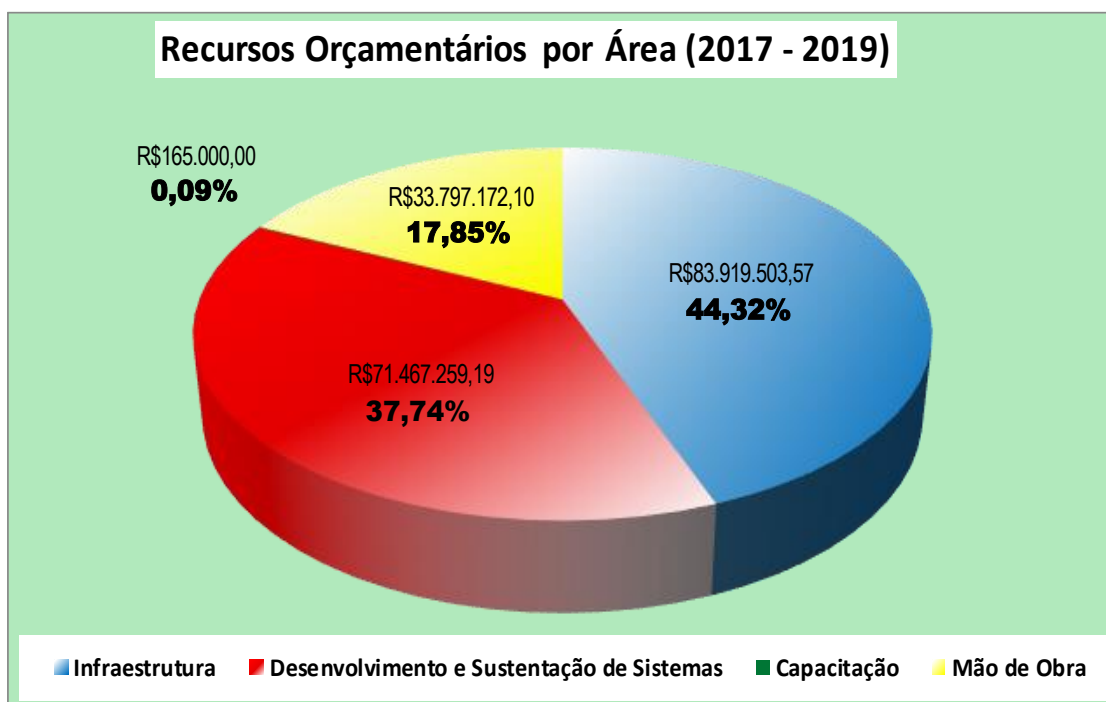




5. Proposta Orçamentária de TIC

Considerando as atualizações dos Planos de Metas e Ação e de Investimento e Custeio, é apresentada abaixo a nova proposta orçamentária para 2019.

Ano	Investimento (R\$)	Custeio (R\$)
2019	R\$ 84.081.984,03	R\$ 43.709.280,07

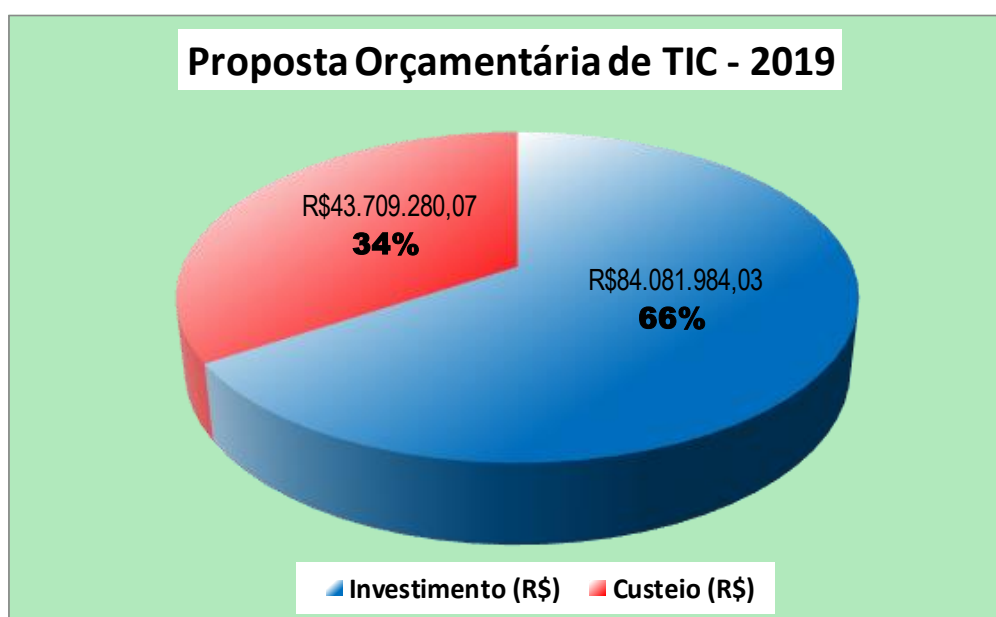



6. Aprovação

Os membros do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGTIC/PCDF aprovaram em 17 de junho de 2019 a 2ª Revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC/PCDF para o período de 2017 a 2019.

ROBSON CÂNDIDO DA SILVA
Diretor Geral e Presidente do CGTIC/PCDF

BENITO AUGUSTO GALIANI TIEZZI
Diretor-Geral Adjunto

ANDERSON JORGE DAMASCENO ESPINDOLA
Corregedor-Geral

SAULO RIBEIRO LOPES
Diretor do Departamento de Inteligência e Gestão da Informação
Secretário Executivo do CGTIC/PCDF

SILVÉRIO ANTÔNIO MOITA DE ANDRADE
Diretor do Departamento de Administração Geral

GUILHERME LORENTZ BLANCK
Diretor do Departamento de Atividades Especiais

RAIMUNDO CLEVERLAND A. MELO
Diretor do Departamento de Polícia Técnica

VICTOR DAN DE ALENCAR ALVES
Diretor do Departamento de Polícia Especializada



JEFERSON LISBOA GIMENEZ

Diretor do Departamento de Polícia Circunscrição

FERNANDO CESAR LIMA DE SOUZA

Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas

GLAUCIA CRISTINA DA SILVA

Diretor da Academia de Polícia Civil

SÉRGIO HENRIQUE DE ARAÚJO MORAES

Chefe da Assessoria da Direção Geral
