




Polícia Civil do Distrito Federal

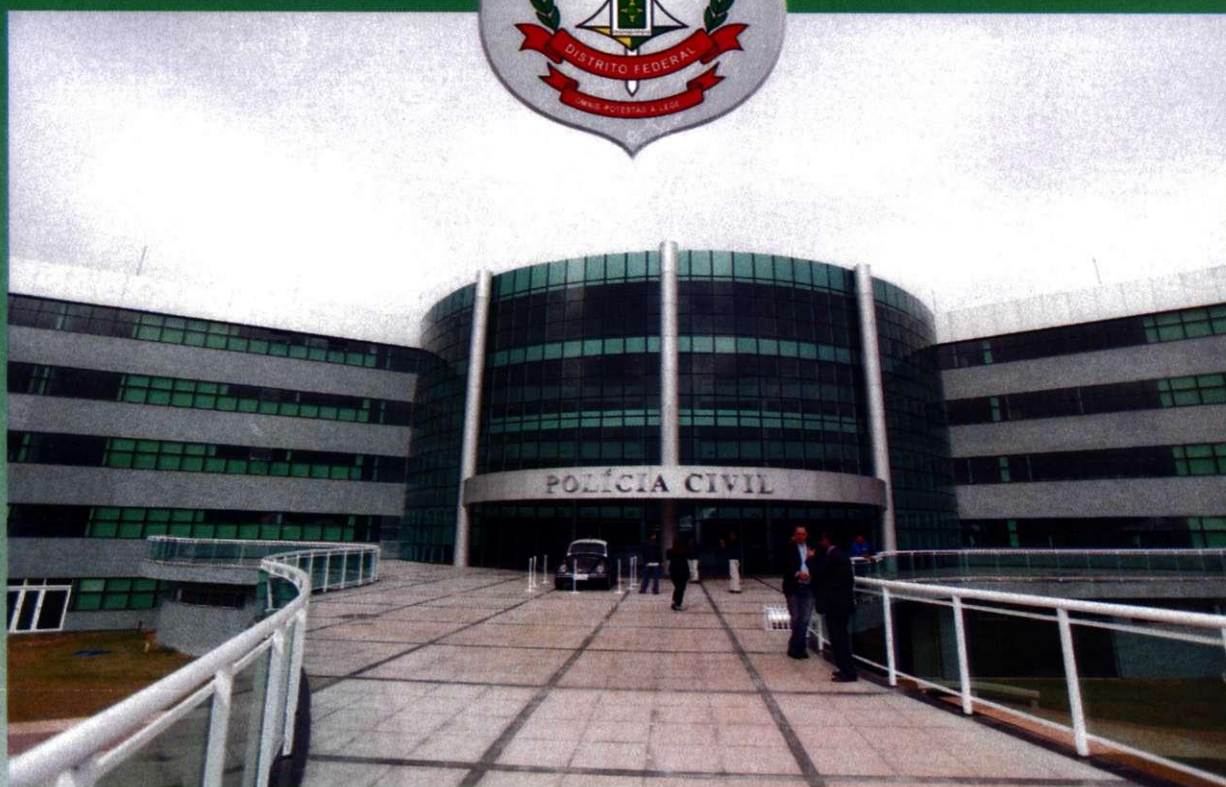

**Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTIC
2017 – 2019**

1ª REVISÃO – Janeiro de 2019



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação CGTIC/PCDF

Presidente

Robson Cândido da Silva

Secretário Executivo

Saulo Ribeiro Lopes – DGI

Demais Membros

Benito Augusto Galiani Tiezzi – DGPC

Anderson Jorge Damasceno Espindola – CGP

Silvério Antônio Moita de Andrade – DAG

Guilherme Lorentz Blanck – DEPATE

Victor Dan De Alencar Alves – DPE

Jeferson Lisboa Gimenez – DPC

Raimundo Cleverland A. Melo – DPT

Fernando Cesar Lima De Souza – DGP

Glaucia Cristina Da Silva – ESPC

Sérgio Henrique de Araújo Moraes –ASS/DGPC

Representantes Técnicos

Charles Fernando Alves – DITEC/DGI

Oswaldo Gilson Victorino Silva – DITEL/DGI



Equipe de Revisão do PDTIC2017-2019

Coordenação

Dr. Saulo Ribeiro Lopes – DGI
Dr. George Estefani de Souza do Couto – DGI
Dra. Ana Carolina Litran Andrade – DGI

Representantes Técnicos

Charles Fernando Alves –DITEC/DGI
Oswaldo Gilson Victorino Silva – DITEL/DGI
Leila Mara Martins – SDEP/DGI
Érika Renata V. B. da Cunha–DITEC/DGI

Colaboradores Técnicos

Baltazar de Deus Pereira – DOF/DAG
Érika Borges Moura do Amaral – DPA/DAG
Giedre Pereira Lopes – CGP
Frederico Guilherme de Brito Leite – DPE
Diogenes Bomfim da Cruz– DPC
Nilson Rodrigues Nunes– DGP
John Milton R. Menezes da Costa – DAME/DEPATE
Priscilla Botelho Marinho das Neves – DOE/DEPATE
Rosber Severo de Oliveira – DOA/DEPATE
Vander André Assunção Salomon–ESPC
Carlos Alberto Elias De Sousa – ESPC
Raimundo Cleverland A. Melo – IC/DPT
Venilton de Siqueira – IML/DPT
Leila Lopes Mizokami – II/DPT
Arthur Svidizinski e Márcio P. Cavalcante – IPDNA/DPT
Robinson Pereira Valadão – CGCV/DPT
Glaiton Pereira Cardoso – CGCV/DPT
José Carlos Silva Ribeiro – AGE/DGPC



Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
Janeiro/2017	1.0	Início dos trabalhos de revisão e atualização do PDTIC 2017 a 2019	Equipe de Elaboração do PDTIC, designada pela OS nº 01/2017 – CGTIC/PCDF
Janeiro/2017	1.0	Aprovação do Plano de Trabalho para a elaboração do PDTIC 2017 a 2019 em 30/01/2017	CGTIC/PCDF
Junho/2017	1.0	Finalização dos trabalhos de revisão e atualização do PDTIC 2017 a 2019	Equipe de Elaboração do PDTIC, designada pela OS nº 01/2017 – CGTIC/PCDF
Junho/2017	1.0	Aprovação do PDTIC 2017 a 2019 em 26/06/2017	CGTIC/PCDF
Julho/2018	1.1	Reunião para início dos trabalhos de Revisão do PDTIC 2017 a 2019	Equipe de Revisão do PDTIC
Agosto/2018	1.1	Reunião para apresentação das tabela de ações da Revisão do PDTIC 2017 a 2019 após os ajustes solicitados pelos Departamentos.	Equipe de Revisão do PDTIC
Janeiro/2019	1.1	Aprovação da Revisão do PDTIC 2017 a 2019	CGTIC/PCDF



Índice

1. Introdução	6
2. Avaliação dos Resultados Alcançados nas Ações previstas no PDTIC 2017 a 2019	11
3. Plano de Metas e de Ações	16
4. Plano de Gestão de Pessoas.....	38
5. Plano de Investimentos e Custeio.....	40
6. Proposta Orçamentária de TIC.....	44
7. Aprovação	45



1. Introdução

O presente documento teve por escopo reunir as informações a serem atualizadas, alteradas, incluídas ou excluídas do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC/PCDF para o Triênio 2017 a 2019.

Os trabalhos e levantamentos para a primeira revisão ocorreram entre os meses de julho e setembro/2018, tendo sido atualizada em janeiro de 2019, sob responsabilidade da Secretaria Executiva do CGTIC/PCDF, por deliberação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Polícia Civil do Distrito Federal – CGTIC/PCDF, em reunião realizada em 21 de março de 2018.

A figura a seguir ilustra as fases que compõem o processo de revisão do PDTIC:




Figura 1 – Fases do Processo de Revisão do PDTIC

Fonte: PDTI/CAPES 2015-2016 - 1ª REVISÃO

A primeira fase do processo de revisão do PDTIC foi realizada por meio de coleta de insumos com as áreas demandantes das soluções de TIC previstas no PDTIC 2017 a 2019, resultando em um diagnóstico da situação atual das ações propostas pelas áreas de negócio da PCDF, o que possibilitou a análise e a readequação das ações.

Dessa forma, a presente revisão buscou promover o alinhamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da PCDF à previsão orçamentária da Instituição para o ano de 2018 e 2019, bem como à necessidade de documentar o andamento da execução das ações planejadas, assegurando a conformidade do PDTIC/PCDF 2017 a 2019 às prioridades institucionais e aos Objetivos Estratégicos definidos no Mapa Estratégico Corporativo 2014 a 2020.

Ademais, a reanálise das ações propostas no PDTIC é resultado do incremento do nível de maturidade da TIC da PCDF, operado por meio da evolução dos seus processos e avaliação das atividades desenvolvidas, refletindo diretamente na melhoria dos serviços prestados à sociedade e aos usuários internos das soluções de TIC da Instituição.

A seguir, são listadas, por seção, as alterações necessárias ao PDTIC 2017/2019 da PCDF. As seções não mencionadas permanecem inalteradas nessa primeira revisão.

Por conseguinte, não sofreram revisão as seções: Apresentação, Introdução, Termos e Abreviações, Metodologia Aplicada, Documentos de Referência, Princípios e Diretrizes, Referencial Estratégico de TIC, Resultados do PDTI Anterior, Alinhamento com a Estratégia da Organização, Inventário de Necessidades, Plano de Gestão de Riscos, Processo de Revisão do PDTIC, Fatores Críticos para a Implantação do PDTIC e Conclusão.

Finalmente, foi incluída a Seção “Avaliação dos Resultados das Ações” previstas no PDTIC 2017 a 2019.




2. Estrutura Organizacional de TIC na PCDF

A PCDF, como parte integrante da Administração Pública do Distrito Federal, tem como um de seus objetivos e desafios acompanhar a modernização do Poder Executivo, bem como prover uma adequada infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Visando atender ao rápido desenvolvimento tecnológico e às demandas especializadas necessárias ao desempenho de suas atribuições legais, a PCDF vem promovendo melhorias constantes de TIC nas suas áreas de atuação, com ênfase nos sistemas corporativos, nas áreas de Inteligência Policial, de Polícia Técnica, além de outros serviços essenciais ao cidadão.

Como Instituição basilar para a Segurança Pública Distrital, atualmente subdividida em diversas Unidades Policiais, cada qual com seus objetivos e competências, a PCDF tem suas particularidades, especialidades e especificidades. O organograma abaixo mostra, em linhas gerais, a organização das áreas de negócio da Instituição, o qual se encontra devidamente atualizado com as recentes reestruturações ocorridas na PCDF, levadas a efeito após a edição da versão original do PDTIC.

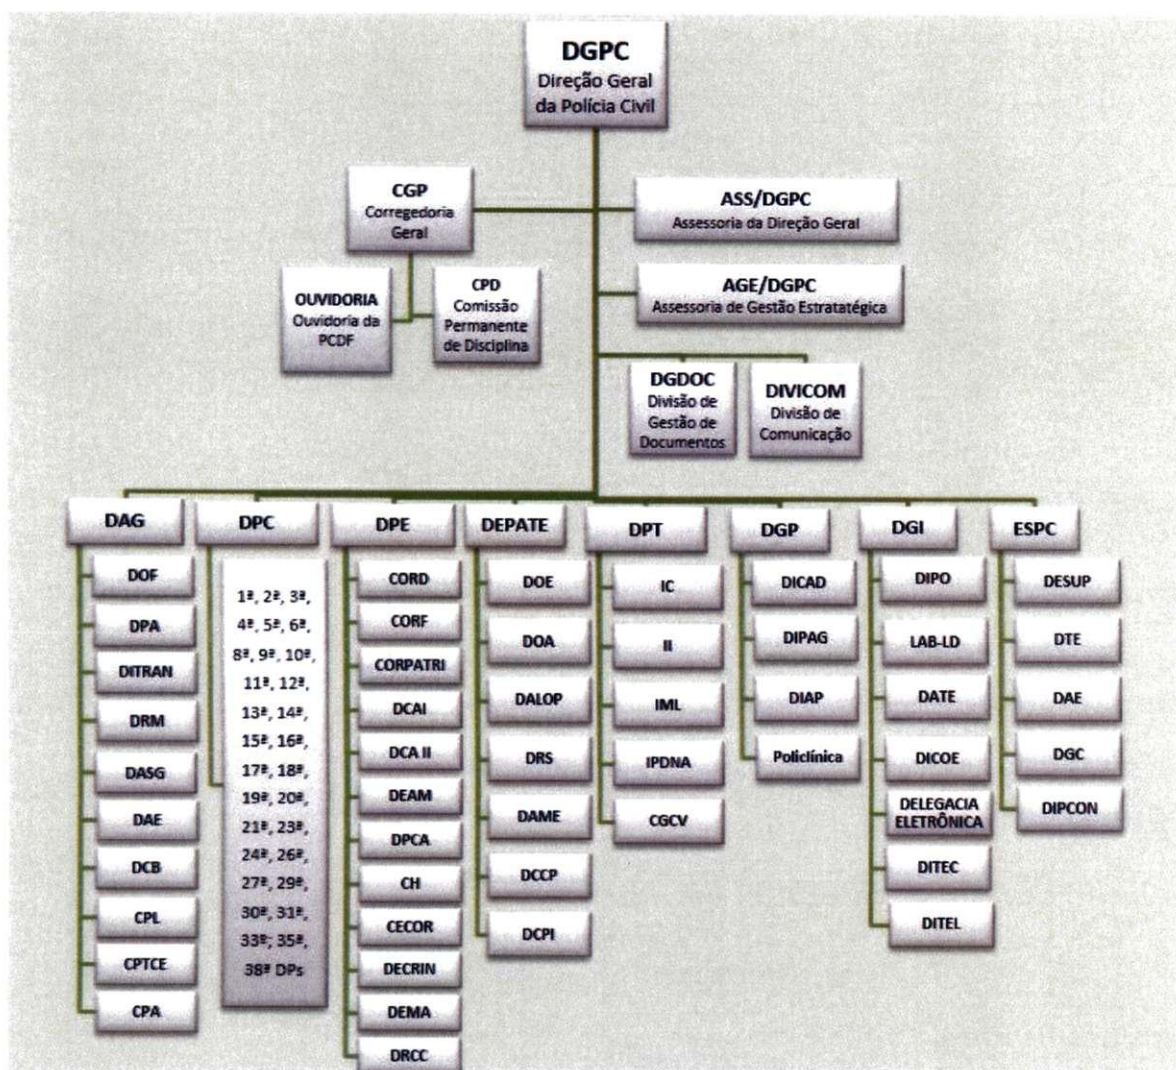




2.1. Do Departamento de Inteligência e Gestão da Informação

O Departamento de Inteligência e Gestão da Informação – DGI, órgão de coordenação técnica e operacional, diretamente subordinado à Direção-Geral da PCDF, tem, dentre suas atribuições, atender, por suas unidades vinculadas, à crescente e ininterrupta demanda institucional por soluções de tecnologia da informação e comunicação, de forma ágil e eficiente.

A Divisão de Tecnologia – DITEC é a unidade subordinada ao DGI responsável por prover e administrar a Infraestrutura de TI, além de desenvolver, manter e gerir os sistemas corporativos da PCDF. Presta ainda, quando necessário, consultoria na contratação dos sistemas e equipamentos de TI adquiridos de terceiros e geridos por outros setores da PCDF, bem como o suporte necessário ao acesso destas soluções pelas demais unidades da Instituição.

A Divisão de Telecomunicações – DITEL é a unidade subordinada ao DGI responsável por prover e administrar todas as atividades de telecomunicações e radiocomunicações da PCDF, prestando suporte técnico e manutenção a toda infraestrutura, sistemas e equipamentos necessários à comunicação institucional.


Organograma do Departamento de Inteligência e Gestão da Informação – DGI

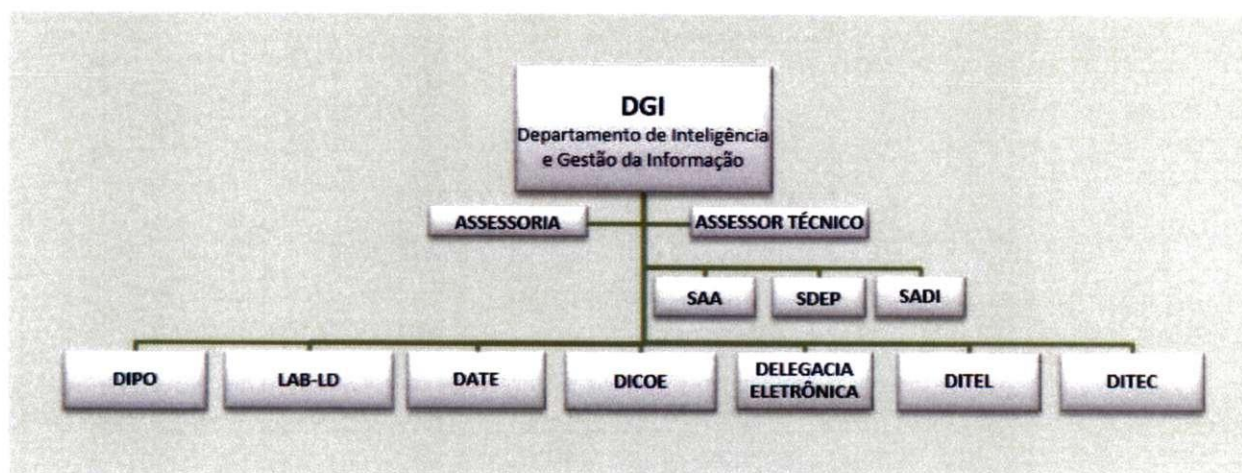

DGI	DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
DIPO	Divisão de Inteligência Policial
LAB-LD	Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro
DATE	Divisão de Análise Técnica e Estatística
DICOE	Divisão de Controle de Denúncias
DE	Delegacia Eletrônica
DITEC	Divisão de Tecnologia
DITEL	Divisão de Telecomunicações



Organograma da Divisão de Tecnologia – DITEC

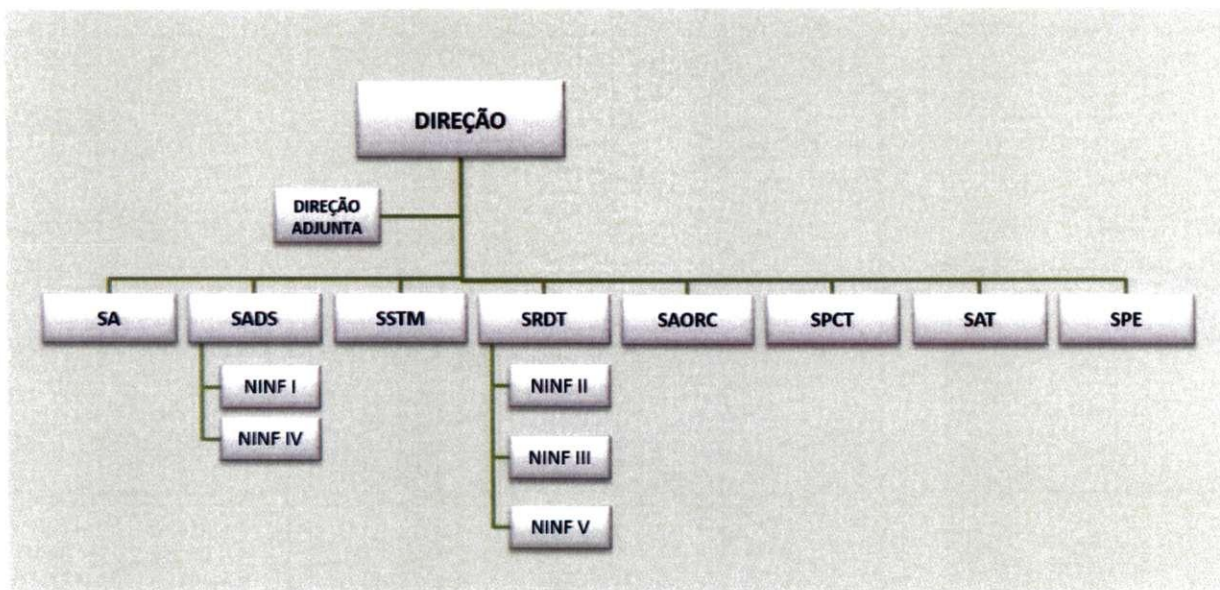


DITEC DIVISÃO DE TECNOLOGIA

SA	Seção de Administração
SADS	Seção de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
SSTM	Seção de Suporte Técnico e Manutenção
SRDT	Seção de Redes de Dados e Teleprocessamento
SAORC	Seção de Análise e Otimização de Recursos Computacionais
SPCT	Seção de Pesquisa Científico-Tecnológica
SAT	Seção de Avanços Tecnológicos
SPE	Seção de Planejamento e Execução
NINF	Núcleo de Informática I, II, III, IV e V



Organograma da Divisão de Telecomunicações – DITEL

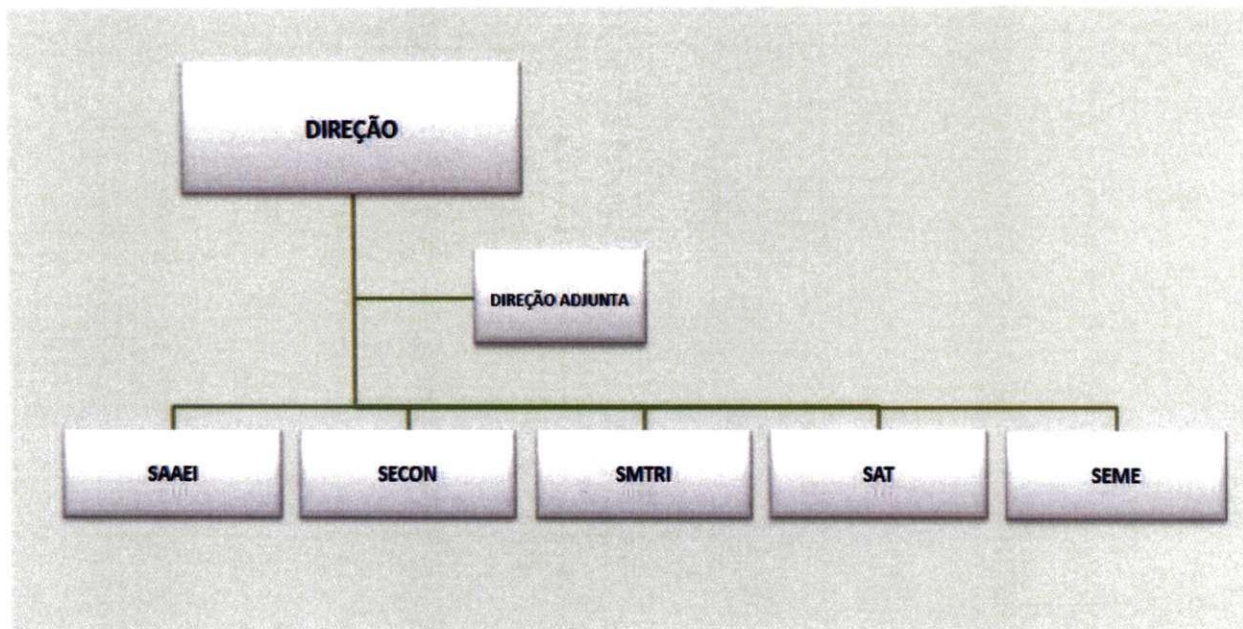

DITEL DIVISÃO DE TELECOMUNICAÇÕES

SAAEI Seção de Apoio Administrativo Estatística e Informática

SECON Seção de Controle de Equipamentos

SMTRI Seção de Telefonia e Redes Internas



SAT Seção de Atendimento Técnico

SEME Seção de Manutenção de Equipamentos



3. Avaliação dos Resultados Alcançados nas Ações previstas no PDTIC 2017 a 2019

Estavam previstas no PDTIC 2017-2019 da PCDF **98** ações, das quais 30 foram TRANSFERIDAS PARA O PRÓXIMO PDTIC e 5 foram EXCLUÍDAS. Dentre as 63 (sessenta e três) ações restantes, **20 (31,75%)** estão em EXECUÇÃO, **13 (20,63%)** estão CONCLUÍDAS e estão no DAG/PCDF aguardando a finalização do processo de contratação, **16 (25,40%)** se encontram com o Planejamento da Contratação EM ANDAMENTO e **14 (22,22%)** ainda NÃO foram INICIADAS.

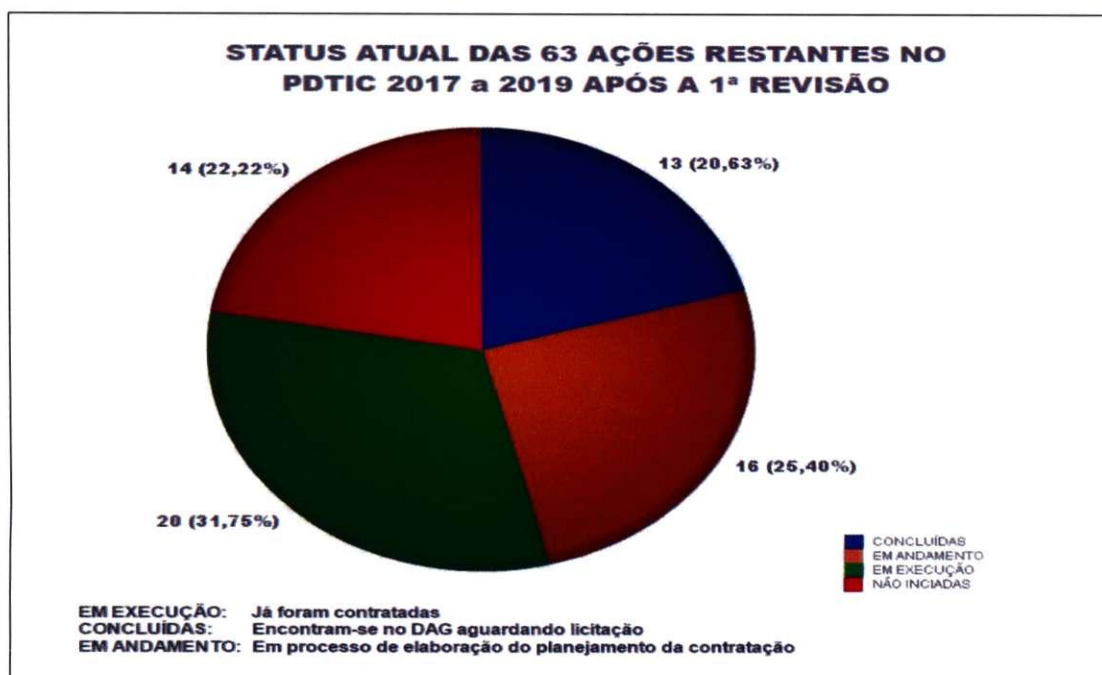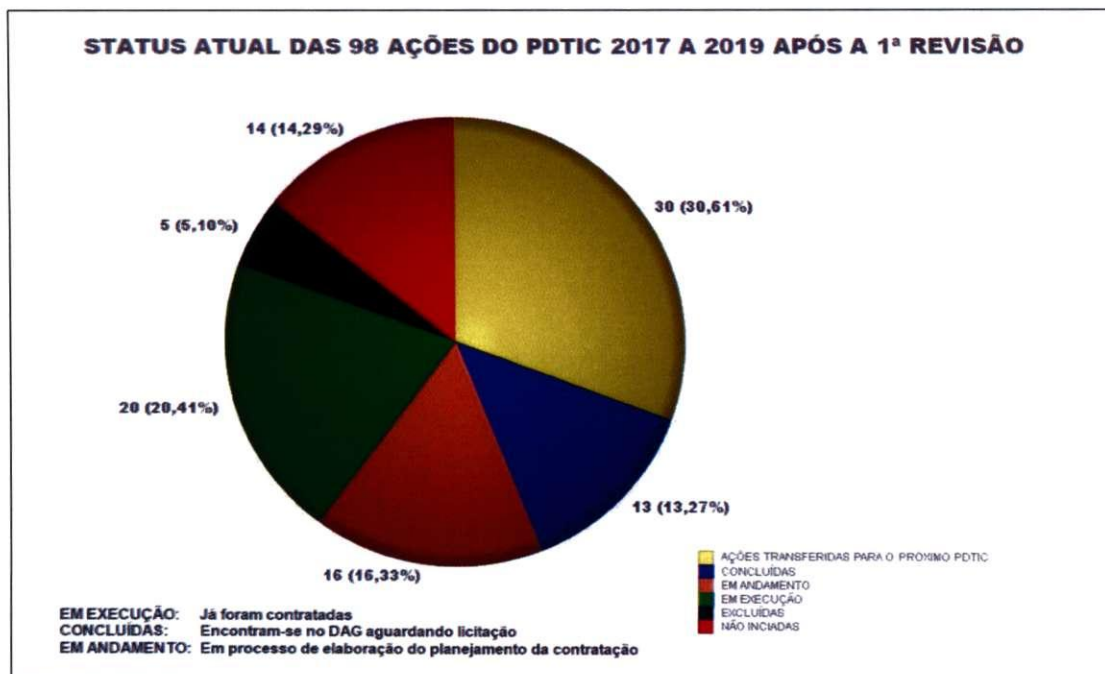

A seguir é apresentada a lista com o status das 63 ações remanescentes após a 1ª Revisão do PDTIC/PCDF 2017 a 2019 e suas respectivas situações:



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



STATUS ATUAL DAS 63 AÇÕES APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC

TOTAL DE AÇÕES				83.348.538,21	97.902.352,32	1.632.346,67	24.827.241,85	5.471.719,13	29.626.363,11	76.244.472,41	43.448.747,36		
AÇÕES EM EXECUÇÃO (20 AÇÕES)				7.110.275,80	18.016.235,98	1.632.346,67	4.725.818,75	5.471.719,13	9.073.762,65	6.210,00	4.216.654,58		
STATUS ATUAL DAS 63 AÇÕES APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC				Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento Total	Custeio Total	Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019
DITEC													
A1	Ampliação/atualização do Licenciamento da Solução de Backup/Restore	2017	2017	1.200.000,00	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
A2	Contratação de serviço de acesso à internet (links)	2017	2017	0,00	520.426,00	0,00	173.475,00	0,00	173.476,00	0,00	173.475,00	0,00	173.475,00
A3	Extensão da garantia, para 2.500 computadores da PCDF	2017	2017	0,00	668.325,00	0,00	668.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	Renovação de Garantia e Suporte técnico dos Servidores HP DL 980	2017	2017	0,00	374.693,88	0,00	124.897,96	0,00	124.897,96	0,00	124.897,96	0,00	124.897,96
A5	Solução antivírus	2017	2017	152.550,00	64.400,00	152.550,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A6	STORAGE - Subsistemas de armazenamento de informações	2017	2018	4.385.048,06	0,00	0,00	0,00	4.385.048,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A7	Fitas LTO6, com etiquetas, e Drive LTO5 para solução de Backup	2017	2017	147.796,67	0,00	147.796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Certificado Digital Padrão ICP-BRASIL para aplicação no sistema SITTEL	2017	2017	16.420,00	0,00	4.000,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00
A12	Certificado SSL do tipo WildCard para o Domínio da PCDF	2017	2017	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A15	Cofre para armazenamento e acondicionamento para fitas LTO	2017	2017	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A22	Balanceador de links / aplicações (cluster)	2017	2018	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A32	Reforma do site principal da PCDF	2018	2018	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DITEL													
A18	Serviços de Telefonia Móvel, local e longa Distância	2017	2017	0,00	5.501.054,00	0,00	1.815.854,00	0,00	1.842.600,00	0,00	1.842.600,00	0,00	1.842.600,00
DGI													
A17	Consultoria/atualização de licenças QlikView	2017	2018	0,00	5.130.230,03	0,00	1.578.866,79	0,00	1.775.681,62	0,00	1.775.681,62	0,00	1.775.681,62
DIPO													
A19	Consultoria/atualização de licenças IBM i2	2017	2018	0,00	4.857.107,07	0,00	0,00	0,00	4.857.107,07	0,00	0,00	0,00	0,00
LABLD													
A65	Aquisição de SOFTWARE DELPHI XE 8	2018	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A87	Aquisição de SOFTWARE DEVEXPRESS VCL (SUBSCRIPTION)	2019	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IC													
A85	HD's, sendo 8 DRSATA 2TB, 12 DR NL-SAS 2TB e 16 DR SATA 4TB	2019	2018	28.623,07	0,00	0,00	0,00	28.623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A95	30 tablets e acessórios, para atender ao Criminal DROID	2018	2018	79.838,00	0,00	0,00	0,00	79.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A96	118 dispositivos de armazenamento para atender necessidade de armazenamento de vídeo e imagem	2018	2018	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



AÇÕES CONCLUÍDAS, EM ANDAMENTO NO DAG (13 AÇÕES)											
				37.697.572,98	62.866.830,28	0,00	16.918.990,38	0,00	16.909.610,84	37.697.572,98	29.038.229,06
STATUS ATUAL DAS 63 AÇÕES APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC				Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento Total	Custeio Total	Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018
II											
A8	Solução de Biometria Digital e emissão de documentos de identificação	2017	2019	23.856.691,52	12.147.244,23	0,00	4.672.200,00	0,00	4.654.820,46	23.856.691,52	2.820.223,77
DITEL											
A14	Parte 1 - Suporte Técnico Especializado em Telefonia e Radiocomunicação	2017	2019	0,00	2.159.508,44	0,00	684.000,00	0,00	692.000,00	0,00	783.508,44
DITEC											
A9	Renovação de Garantia e Suporte técnico da Solução Blade Cisco	2017	2019	0,00	250.176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.176,96
A11	Solução de impressão, cópia e digitalização a fim de atender necessidades gerais e específicas das unidades policiais da PCDF	2017	2019	0,00	9.036.906,11	0,00	2.146.708,75	0,00	2.146.708,75	0,00	4.743.488,61
A13	Serviços de suporte técnico e sustentação dos sistemas corporativos e ao ambiente tecnológico da PCDF	2017	2019	0,00	30.183.968,76	0,00	6.996.539,56	0,00	6.996.539,56	0,00	16.190.889,64
A63	Licenças VMware em sua versão mais atualizada	2018	2019	1.602.351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.351,16	0,00
A20	Licenças de softwares de infraestrutura e desenvolvimento Microsoft	2017	2019	0,00	4.956.283,54	0,00	1.353.170,95	0,00	1.353.170,95	0,00	2.249.941,64
A26	Maletas de ferramentas para manutenção preventiva e corretiva dos sistemas DITEC	2017	2019	8.168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,36	0,00
A24	Site (DATACENTER) de contingência da PCDF	2017	2019	7.262.048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262.048,61	0,00
A48	Aquisição de Servidores de Rede para Rack para as Unidades da PCDF	2018	2019	2.624.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624.832,50	0,00
A55	Solução de Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança para Resposta a Incidentes de Segurança da Informação - SIEM	2018	2019	2.069.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.547,50	0,00
LABLD											
A48	Servidores de Rede para o LABLD	2018	2019	169.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.933,33	0,00
DIPO											
A34	Renovação de suporte técnico, Atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva do sistema GUARDIÃO	2018	2019	0,00	3.332.742,24	0,00	1.066.371,12	0,00	1.066.371,12	0,00	1.200.000,00
IC											
A53	Soluções que permitam a extração de dados	2018	2019	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
A97	Dois switches, oito computadores, dois servidores e trinta e dois HD's	2018	2019	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



AÇÕES EM ANDAMENTO (16 AÇÕES)				27.209.989,43	11.444.286,06	0,00	2.880.432,72	0,00	3.340.989,62	27.209.989,43	5.222.863,72		
STATUS ATUAL DAS 63 AÇÕES APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC				Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento Total	Custeio Total	Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019
IPDNA/CGCV													
A21	Manutenção, atualização, treinamento e suporte do Sistema LIMS	2017	2019	0,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	56.000,00	
DITEC													
A42	Certificado Digital do Tipo A3 Token ou SmartCard com personalização para 5.800 servidores policiais	2018	2019	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
A37 e A54	Solução de Monitoramento de Performance de Aplicações (APM) e solução de gerenciamento de desempenho de rede e aplicações (NPM).	2018	2019	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
A47	Controlador de rede sem fio Wi-Fi para rede corporativa e de Pontos de Acesso de Rede, Access Point, Wi-Fi para as Unidades da Rede Corporativa da PCDF	2018	2019	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
A64	Computadores do Tipo Workstation para unidades Técnicas	2018	2019	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
A71	Serviços de telecomunicações para rede metropolitana da PCDF, utilizando tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching)	2019	2019	0,00	4.424.591,16	0,00	1.474.863,72	0,00	1.474.863,72	0,00	1.474.863,72	0,00	1.474.863,72
A73	Estações de trabalho iMac de 21,5 polegadas "on site"	2019	2019	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
A76	Solução de Segurança da Informação para a Auditoria e Rastreabilidade no Ambiente de Domínio e Servidores de arquivo (Ferramenta de Auditoria)	2019	2019	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00
A78	Micro computadores para as unidades policiais	2019	2019	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00
A84	Solução de segurança de redes (Firewall, IPS, dentre outros)	2019	2019	0,00	2.100.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
A90	Extensão de garantia/suporte técnico de unidade robotica (tape drive) com seis drives LTO 6.	2019	2019	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
DITEL													
A14	Parte 2 - Contratação de Suporte Técnico Especializado Residente, com substituição de componentes e partes, para as Centrais Telefônicas (CPCT) Mitel/Aastra/MXOne da Polícia Civil do Distrito Federal.	2017	2019	670.000,00	783.694,90	0,00	205.569,00	0,00	226.125,90	670.000,00	352.000,00		
A36	Contratação de Serviços de Telefonia Fixa, local e longa Distância	2018	2019	0,00	3.520.000,00	0,00	500.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	2.500.000,00
A16	Digitalização do Sistema de Rádio (Aquisição de Infraestrutura e equipamentos Tetra e de Repetidoras Híbridas)	2017	2019	6.809.973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809.973,08	0,00
A16	Digitalização do Sistema de Rádio (Aquisição de Infraestrutura e equipamentos Tetra e de Repetidoras Híbridas)	2018	2019	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
A16	Digitalização do Sistema de Rádio (Aquisição de Infraestrutura e equipamentos Tetra e de Repetidoras Híbridas)	2016	2019	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
A33	Parte 1 - Aquisição de equipamentos ... para telefonia IP do Sistema Telefônico da PCDF	2018	2019	585.016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.016,35	0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



AÇÕES NÃO INICIADAS (14 AÇÕES)				11.330.700,00	5.575.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00	11.330.700,00	4.971.000,00		
STATUS ATUAL DAS 63 AÇÕES APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC				Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento Total	Custeio Total	Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019
DCCP													
A45	Suporte e manutenção da Solução de Gestão de Presos - SPIS/SISPEN	2018	2019	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
DGPC													
A88	Suporte Técnico com atualização de licenças e Help Desk de forma continuada para o Sistema ASI	2019	2019		900.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
A89	Licenças do software Folio Workbench Builder e licença do software Folio Views	2019	2019	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DITEC													
A62	Aquisição de scanners, impressoras específicas e equipamentos de multimídia	2018	2019	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
A72	Servidores de Rede para Virtualização VMWare para o Datacenter da PCDF	2019	2019	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
A57	Treinamento em Banco de Dados SQL Server e Oracle	2018	2019	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
A59	Acessórios para os switches (Transceivers óticos, cabo stack, GbIC)	2018	2019	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
A82	Software de gestão acadêmica, contratação de serviços de consultoria	2019	2019	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
IC/DAE													
A35	Softwares especialista para desenvolvimento, editoração, projetos, entre outros	2018	2019	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
IC													
A46	Solução/ plataforma integrada única para automação de laudos e relatórios periciais, da gestão de informações laboratoriais entre outras informações e da garantia de cadeia de custódia para os institutos da Polícia Técnica e demais unidades da PCDF no controle de vestígios.	2018	2019	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
DGP													
A40	Serviços de higienização, organização, classificação, digitalização, registro de metadados dos documentos que constituem as pastas funcionais dos servidores da PCDF	2018	2019	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
IML/Policlínica													
A98	Solução em Tecnologia da Informação em saúde ocupacional, assistencial e pericial da Policlínica e IML/PCDF.	2019	2019	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
DITEL													
A16	Digitalização do Sistema de Rádio (Aquisição de Infraestrutura e equipamentos Tetra e de Repetidoras Híbridas)	2017	2019	700.000,00								700.000,00	
A28	Aquisição de insumos para manutenção básica em rádio e telefonia	2017	2019	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
DECRIM													
A83	Soluções que viabilizem a coleta de informações de vítimas com deficiência física, auditiva e/ou visual	2019	2019	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00	0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



4. Plano de Metas e de Ações

No decorrer do período de vigência do PDTIC, percebeu-se a premência de se repriorizar as necessidades de TIC, considerando as alterações no cenário interno e externo ocorridas no período, assim como de se readequar o número de projetos previstos à capacidade de execução da área negocial. A repriorização foi devidamente submetida e aprovada pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGTIC/PCDF.

Algumas ações necessitaram de revisão e atualização para acompanhar novas necessidades mapeadas durante o período de execução do PDTIC, bem como devido às restrições orçamentárias da Instituição.

Nessa linha, considerando as ações inicialmente previstas, algumas foram REPRIORIZADAS, INCLUÍDAS, ALTERADAS, EXCLUÍDAS e, ainda, TRANSFERIDAS para o próximo PDTIC, tendo como resultado um Plano de Metas e Ações atualizado, conforme tabelas abaixo:

1) AÇÕES REPRIORIZADAS

AÇÕES REPRIORIZADAS NA PRIMEIRA REVISÃO DO PDTIC 2017 a 2019									
ID	Departamento	Responsável	Ação	Qtd	Investimento Total	Custeio Total	Previsão Inicial	Repriorização	Motivo da Repriorização
A6	DGI	DITEC	Contratação de empresa especializada no fornecimento de 02 (dois) subsistemas de armazenamento de informações com capacidade para armazenar até 800 (oitocentos) terabytes em Alta Disponibilidade Ativo-Ativo, com Transferência de conhecimento, suporte técnico e manutenções por 60 (sessenta) meses.	2	R\$ 4.385.048,06	R\$ -	2017	2018	Mudanças de requisitos do projeto
A8	DPT	II	Desenvolver projeto para Contratação de Empresa para prestação de serviços de suporte técnico, Atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva da Solução de Biometria Digital e emissão de documentos de identificação	1	R\$ 23.856.691,52	R\$ 12.147.244,23	2017	2019	Pregão Eletrônico suspenso pelo TCDF
A9	DGI	DITEC	Renovação de Garantia e Suporte técnico da Solução Blade Cisco (Chassi, lâminas e switches de ligação)	1	R\$ -	R\$ 250.176,96	2017	2019	Aguardando finalização do processo licitatório



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



AÇÕES REPRIORIZADAS NA PRIMEIRA REVISÃO DO PDTIC 2017 a 2019									
ID	Departamento	Responsável	Ação	Qtd	Investimento Total	Custeio Total	Previsão Inicial	Repriorização	Motivo da Repriorização
A11	DGI	DITEC	Contratação de solução de impressão, cópia e digitalização a fim de atender necessidades gerais e específicas das unidades policiais da PCDF	1	R\$ -	R\$ 9.036.906,11	2017	2019	Aguardando finalização do processo licitatório
A13	DGI	DITEC	Contratação de empresa para provimento de Mão de Obra técnica especializada para prestação de serviços de suporte técnico e sustentação dos sistemas corporativos e ao ambiente tecnológico da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF	1	R\$ -	R\$ 30.183.968,76	2017	2019	Aguardando finalização do processo licitatório
A14	DGI	DITEL	Contratação de Suporte Técnico Especializado em Telefonia e Radiocomunicação & contratação de Suporte Técnico Especializado Residente, com substituição de componentes e partes, para as Centrais Telefônicas (CPCT) Mitel/Aastra/MX-One da Polícia Civil do Distrito Federal.	2	R\$ -	R\$ 2.159.508,44	2017	2019	Mudanças de requisitos do projeto e na Equipe
A16	DGI	DITEL	Modernização do parque tecnológico de radiocomunicação: digitalização do Sistema de Rádio (Aquisição de Infraestrutura e equipamentos Tetra e de Repetidoras Híbridas)	2050	R\$ 8.329.973,08	R\$ -	2017	2019	Mudanças de requisitos do projeto e Restrições Orçamentárias
A17	DGI	DGI	Renovação da prestação de serviços técnicos especializados, modalidade conhecida como on site, através da alocação de profissionais dentro do ambiente da PCDF e ampliação/atualização de licenças QlikView	180 licenças named call 395 licenças document call e 02 Consultores	R\$ -	R\$ 5.130.230,03	2017	2018	Mudanças de requisitos do projeto
A19	DGI	DIPO	Contratação de empresa especializada para atualização de licenças IBM i2, destinadas à modernização de Ferramenta de Análise de Inteligência Policial, prestação de serviços de suporte técnico para a implementação e operação da solução e serviços de treinamento na última versão disponibilizada pelo fabricante, treinamento e prestação de serviços especializados para continuidade, reestruturação e potencialização do “Sistema Cérebro” da PCDF	1	R\$ -	R\$ 4.857.107,07	2017	2018	Mudanças de requisitos do projeto



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



AÇÕES REPRIORIZADAS NA PRIMEIRA REVISÃO DO PDTIC 2017 a 2019											
ID	Departamento	Responsável	Ação	Qtd	Investimento Total		Custeio Total		Previsão Inicial	Repriorização	Motivo da Repriorização
A20	DGI	DITEC	Aquisição de licenças de softwares de infraestrutura e desenvolvimento Microsoft	4.247 licenças	R\$	-	R\$	4.956.283,54	2017	2019	Aguardando finalização do processo licitatório
A21	DPT	IPDNA/C GCV	Renovar o contrato de manutenção, atualização, treinamento e suporte do Sistema de Administração de Informações Laboratoriais, LIMS	1	R\$	-	R\$	476.000,00	2017	2019	Mudanças de requisitos do projeto
A22	DGI	DITEC	Aquisição de balanceador de links / aplicações (cluster)	1	R\$	370.000,00	R\$	-	2017	2018	Restrições Orçamentárias
A24	DGI	DITEC	Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de ambiente de alta disponibilidade e segurança para o CPD do site de contingência da PCDF	1	R\$	7.262.048,61	R\$	-	2017	2018	Mudanças de requisitos do projeto e Restrições Orçamentárias
A26	DGI	DITEC	Aquisição de maletas de ferramentas para manutenção preventiva e corretiva própria dos sistemas DITEC	8 Unidades	R\$	8.168,36	R\$	-	2017	2019	Mudanças de requisitos do projeto e na Equipe
A28	DGI	DITEL	Aquisição de insumos para manutenção básica em rádio e telefonia	1	R\$	-	R\$	54.000,00	2017	2019	Mudanças de requisitos do projeto
A33	DGI	DITEL	Aquisição de equipamentos e ampliação de licença para telefonia IP do Sistema Telefônico Mitel/Aastra/MX-One (versão 5.0) da Polícia Civil do Distrito Federal	501	R\$	585.016,35	R\$	-	2018	2019	Mudanças de requisitos do projeto e Restrições Orçamentárias
A34	DGI	DIPO	Renovação de suporte técnico, Atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva do sistema GUARDIÃO	1	R\$	-	R\$	3.332.742,24	2018	2019	Aguardando finalização do processo de contratação
A35	DPT/DAG	IC/DAE	Aquisição de softwares especialista para desenvolvimento, editoração, projetos, entre outros	1	R\$	750.000,00	R\$	-	2018	2019	Mudanças de requisitos do projeto e Restrições Orçamentárias
A36	DGI	DITEL	Contratação de Serviços de Telefonia Fixa, local e longa Distância	1	R\$	-	R\$	3.520.000,00	2018	2019	Mudanças de requisitos do projeto e na Equipe
A37	DGI	DITEC	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Solução de Monitoramento de Performance de Aplicações (APM), com transferência de conhecimento, suporte técnico, e manutenções por no mínimo 36 (trinta e seis) meses	1	R\$	400.000,00	R\$	-	2018	2019	Mudanças de requisitos do projeto e Restrições Orçamentárias



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



ID	Departamento	Responsável	Ação	Qtd	Investimento Total	Custeio Total	Previsão Inicial	Repriorização	Motivo da Repriorização
A38	DGI	DITEC	Contratação de empresa especializada para suporte técnico integral e atualização do parque tecnológico da rede WIMAX da PCDF	1	R\$ -	R\$ 2.400.000,00	2018	2019	Mudanças de requisitos do projeto e Restrições Orçamentárias
A40	DGP	DGP	Contratação de empresa para prestação dos serviços de higienização, organização, classificação, digitalização, registro de metadados dos documentos que constituem as pastas funcionais dos servidores da PCDF com transferência de tecnologia e o fornecimento, mediante sistema de registro de preços, de equipamentos para digitalização - scanners e monitores de vídeo, incluindo a prestação de garantia on site dos equipamentos pelo período de 36 (trinta e seis) meses, nas condições estabelecidas no instrumento convocatório	15000	R\$ -	R\$ 450.000,00	2018	2019	Mudanças de requisitos do projeto e Restrições Orçamentárias
A41	DGI	DITEC	Aquisição de switches do Tipo Topo de Rack, LICENÇA OSPF (full L3) e com Software de Gerência	4 unidades	R\$ 460.000,00	R\$ -	2018	2019 (conjunto c/ A 41, 47, 59 e 60)	Mudanças de requisitos do projeto e Restrições Orçamentárias
A42	DGI	DITEC	Aquisição de Certificado Digital do Tipo A3 Token ou SmartCard com personalização para 5.800 servidores policiais	5800	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	2018	2019	Restrições Orçamentárias
A43	DGI	DITEC	Contratação de empresa para treinamento em modelagem de DW/BI e utilização de softwares Data Mining	5 pessoas	R\$ -	R\$ 102.000,00	2018	2019	Mudanças de requisitos do projeto e Restrições Orçamentárias
A45	DEPATE	DCCP	Contratação de Empresa especializada no Suporte e manutenção da Solução de Gestão de Presos - SPIS/SISPEN	1	R\$ -	R\$ 1.200.000,00	2018	2019	Mudanças de requisitos do projeto e Restrições Orçamentárias
A46	DPT	IC	Solução/ plataforma integrada única para automação de laudos e relatórios periciais, da gestão de informações laboratoriais, de dados científicos, dos procedimentos técnicos, dos equipamentos analíticos, do controle de estoque de consumíveis e da garantia de cadeia de custódia para os institutos da Polícia Técnica (Instituto de Criminalística, Instituto de Medicina Legal, Instituto de Identificação, Instituto de Pesquisa de DNA Forense e Central de Guarda e Custódia de Vestígios) e demais unidades da PCDF no controle de vestígios.	1	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	2018	2019	Mudanças de requisitos do projeto e Restrições Orçamentárias



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



AÇÕES REPRIORIZADAS NA PRIMEIRA REVISÃO DO PDTIC 2017 a 2019									
ID	Departamento	Responsável	Ação	Qtd	Investimento Total	Custeio Total	Previsão Inicial	Repriorização	Motivo da Repriorização
A47	DGI	DITEC	Aquisição de Controlador de rede sem fio Wi-Fi para rede corporativa e de Pontos de Acesso de Rede, Access Point, Wi-Fi para as Unidades da Rede Corporativa da PCDF	02 unidades	R\$ 580.000,00	R\$ -	2018	2019 (conjunto c/ A 41, 47, 59 e 60)	Mudanças de requisitos do projeto e Restrições Orçamentárias
A48	DGI	DITEC	Aquisição de Servidores de Rede para Rack para as Unidades da PCDF	50 Servidores	R\$ 2.624.832,50	R\$ -	2018	2019	Mudanças de requisitos do projeto e Restrições Orçamentárias
A53	DPT	IC	Aquisição de soluções que permitam a extração de dados para aplicação em diversas áreas, tais como, telefonia, informática, veicular, para posterior análise forense e ser utilizada como meio probatório	1	R\$ -	R\$ 800.000,00	2018	2019	Aguardando finalização do processo de contratação
A54	DGI	DITEC	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de gerenciamento de desempenho de rede e aplicações, o Network Performance Monitor (NPM) da Rede Corporativa da PCDF, com transferência de conhecimento, suporte técnico, e manutenções por no mínimo 36 (trinta e seis) meses	1	R\$ -	R\$ 900.000,00	2018	2019	Mudanças de requisitos do projeto e Restrições Orçamentárias
A55	DGI	DITEC	Aquisição de Solução de Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança para Resposta a Incidentes de Segurança da Informação - SIEM (Security Information and Event Management)	1	R\$ 2.069.547,50	R\$ -	2018	2019	Mudanças de requisitos do projeto e Restrições Orçamentárias
A57	DGI	DITEC	Contratação de empresa para treinamento em Banco de Dados SQL Server e Oracle	5 pessoas	R\$ -	R\$ 165.000,00	2018	2019	Mudanças de requisitos do projeto e Restrições Orçamentárias
A59	DGI	DITEC	Aquisição de acessórios para os switches (Transceivers óticos, cabo stack, GbIC)	115	R\$ 700.000,00	R\$ -	2018	2019 (conjunto c/ A 41, 47, 59 e 60)	Mudanças de requisitos do projeto e Restrições Orçamentárias



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



AÇÕES REPRIORIZADAS NA PRIMEIRA REVISÃO DO PDTIC 2017 a 2019									
ID	Departamento	Responsável	Ação	Qtd	Investimento Total	Custeio Total	Previsão Inicial	Repriorização	Motivo da Repriorização
A60	DGI	DITEC	Aquisição de switches de acesso 48 portas PoE para alocação nas unidades em construção/reforma e para substituição dos equipamentos sem garantia que apresentarem problema	255 Unidades	R\$ 5.718.885,00	R\$ -	2018	2019 (conjunto c/ A 41, 47, 59 e 60)	Mudanças de requisitos do projeto e Restrições Orçamentárias
A62	DGI	DITEC	Aquisição de scanners, impressoras específicas e equipamentos de multimídia	120 Unidades	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	2018	2019	Mudanças de requisitos do projeto e Restrições Orçamentárias
A63	DGI	DITEC	Aquisição de licenças VMware em sua versão mais atualizada à época de contratação	12 Licenças	R\$ 1.602.351,16	R\$ -	2018	2019	Aguardando finalização do processo licitatório
A64	DGI	DITEC	Aquisição de computadores do Tipo Workstation para unidades Técnicas	200	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	2018	2019	Mudanças de requisitos do projeto e Restrições Orçamentárias
A87	DGI	LABLD	Aquisição de SOFTWARE DEVEXPRESS VCL (SUBSCRIPTION)	1	R\$ 8.000,00	R\$ -	2019	2018	Mudanças de requisitos do projeto.
A97	DPT	IC	Aquisição de dois switches, oito computadores, dois servidores e trinta e dois HD's	2, 8 e 32	R\$ 104.000,00	R\$ -	2018	2019	Aguardando finalização do processo licitatório

2) AÇÕES ALTERADAS

AÇÕES ALTERADAS NA PRIMEIRA REVISÃO DO PDTIC 2017 a 2019								
ID	Departamento	Responsável	Ação	Qtd	Investimento Total	Custeio Total	Previsão Inicial	Motivo da Alteração
A11	DGI	DITEC	Contratação de solução de impressão, cópia e digitalização a fim de atender necessidades gerais e específicas das unidades policiais da PCDF	1	R\$ -	R\$ 8.146.708,75	dez-17	Diminuição do escopo da contratação
A35	DPT/DAG	IC/DAE	Aquisição de softwares especialista para desenvolvimento, editoração, projetos, entre outros	1	R\$ 750.000,00	R\$ -	dez-18	Ajuste no escopo da contratação
A62	DGI	DITEC	Aquisição de scanners, impressoras específicas e equipamentos de multimídia	120 Unidades	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	dez-18	Ajuste no escopo da contratação
A64	DGI	DITEC	Aquisição de computadores do Tipo Workstation para unidades Técnicas	200	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	dez-18	Ajuste no escopo da contratação



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



3) AÇÕES INCLUÍDAS

AÇÕES INCLUÍDAS NA PRIMEIRA REVISÃO DO PDTIC 2017 a 2019								
ID	Departamento	Responsável	Ação	Qtd	Investimento Total	Custeio Total	Previsão Inicial	Situação Atual
A85	DPT	IC	Aquisição de HD's, sendo 8 DRSATA 2TB, 12 DR NL-SAS 2TB e 16 DR SATA 4TB	36	R\$ 28.623,07	R\$ -	2019	Ação aprovada pelo CGTIC para inclusão no PDTIC, Ata nº 9 de 09/10/2017
A95	DPT	IC	Aquisição de 30 tablets e acessórios, para atender ao Criminal DROID	30	R\$ 79.838,00	R\$ -	2018	Ação aprovada pelo CGTIC para inclusão no PDTIC, Ata nº 9 de 09/10/2017
A96	DPT	IC	Aquisição de 118 dispositivos de armazenamento para atender necessidade de armazenamento de vídeo e imagem	118	R\$ 224.000,00	R\$ -	2018	Ação aprovada pelo CGTIC para inclusão no PDTIC, Ata nº 9 de 09/10/2017
A97	DPT	IC	Aquisição de dois switches, oito computadores, dois servidores e trinta e dois HD's		R\$ 104.000,00	R\$ -	2018	Ação aprovada pelo CGTIC para inclusão no PDTIC, Ata nº 9 de 09/10/2017
A98	DGP/ DPT	Policlínica e IML	Aquisição de solução de saúde ocupacional, assistencial e pericial da Policlínica e IML/PCDF.	1	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	2019	Ação incluída para atender necessidade da Policlínica/IML



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



4) AÇÕES EXCLUÍDAS

AÇÕES EXCLUÍDAS NA PRIMEIRA REVISÃO DO PDTIC 2017 a 2019								
ID	Departamento	Responsável	Ação	Qtd	Investimento Total	Custeio Total	Previsão Inicial	Motivo da Exclusão
A25	DPT	2017	Contratação de suporte técnico, atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva do sistema CODIS	1	R\$ -	R\$ 120.000,00	2017	EXCLUÍDA pois já houve aquisição do objeto em projeto anterior ao PDTIC
A30	DPT	2017	Contratação de empresa especializada em suporte técnico e manutenção das solução IDX	1	R\$ -	R\$ 300.000,00	2017	EXCLUÍDA pois já houve aquisição do objeto em projeto anterior ao PDTIC
A39	DGI	DITEC	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Solução de Vídeo Wall para 02 (duas) salas do centro de monitoramento do DGI/ PCDF	1	R\$ 1.354.047,91	R\$ -	2018	EXCLUÍDA pois já houve aquisição do objeto em projeto anterior ao PDTIC
A92	DEPATE	DOA	Aquisição de equipamentos complementares para o Sistema de Imageamento Aéreo - FLIR		R\$ 5.136.450,00	R\$ -	2019	EXCLUÍDA pois a aquisição do objeto está sendo feita em projeto da SENASP
A93	DGI	DITEC	Digitalização de documentos e automação de processos SEI	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	2019	EXCLUÍDA pois a demanda foi incorporada à A11



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



5) AÇÕES TRANSFERIDAS PARA O PRÓXIMO PDTIC

AÇÕES TRANSFERIDAS PARA O PRÓXIMO PDTIC NA PRIMEIRA REVISÃO DO PDTIC 2017 a 2019									
ID	Departamento	Responsável	Ação	Qtd	Previsão Investimento Total		Previsão Custeio Total	Previsão Inicial	Motivo da Transferência
A23	DGI	LABLD	Aquisição de licenças de banco de dados ORACLE	2	R\$	532.000,00	R\$ -	2017	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023
A27	DGI	DITEC	Contratação de empresas para promoção de programas para nivelamento de conhecimento entre as equipes técnicas da DITEC	1	R\$	-	R\$ 249.000,00	2017	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023
A29	DPT	GAB	Aquisição de solução para a implantação do Sistema integrado controle de perícias e chamados, composto de telas multimídias para a exibição em tempo real dos dados periciais, deslocamentos e suporte de pessoal	1	R\$	100.000,00	R\$ -	2017	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023
A31	DGI	DICOE	Contratação de empresa para prestação de serviço de modernização do call center para teleatendimento policial e sistema de denúncia	1	R\$	400.000,00	R\$ -	2018	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023
A38	DGI	DITEC	Contratação de empresa especializada para suporte técnico integral e atualização do parque tecnológico da rede WIMAX da PCDF	1	R\$	-	R\$ 2.400.000,00	2018	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023
A41	DGI	DITEC	Aquisição de switches do Tipo Topo de Rack, LICENÇA OSPF (full L3) e com Software de Gerência	4	R\$	460.000,00	R\$ -	2018	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023
A43	DGI	DITEC	Contratação de empresa para treinamento em modelagem de DW/BI e utilização de softwares Data Mining	1	R\$	-	R\$ 102.000,00	2018	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023
A44	DGI	DITEC	Contratação de empresa para prestação de serviços de sustentação do Sistema SISDAME - EMC Documentun, e de customização para ferramenta de gerenciamento eletrônico de documentos contemplando implementação de fluxo de trabalho (workflow), consultoria e transferência de tecnologia	1	R\$	-	R\$ 1.360.000,00	2018	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



AÇÕES TRANSFERIDAS PARA O PRÓXIMO PDTIC NA PRIMEIRA REVISÃO DO PDTIC 2017 a 2019

ID	Departamento	Responsável	Ação	Qtd	Previsão Investimento Total	Previsão Custeio Total	Previsão Inicial	Motivo da Transferência
A49	DGI	DITEC	Aquisição de notebooks/ultrabooks/tablets com garantia total de 36 meses	1	R\$ -	R\$ 1.593.000,00	2018	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023
A50	DGI	DITEC	Permissão de acesso a informações de suspeitos nos Bancos de dados de terceiros (Checkcheck -SPC Brasil, SERPRO, SINAP, TCPO, ORSE, SBC)	1	R\$ -	R\$ 35.000,00	2018	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023
A51	DGI	DIPO	Aquisição de Solução Integrada de Análise Forense Computacional	1	R\$ 500.000,00	R\$ -	2018	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2024
A52	DGI	DATE	Atualização de Licenças existentes para ARCGIS 9.3 e 10.0 / Aquisição de Licenças novas para ARCGIS 10.3.1	6	R\$ 26.000,00	R\$ 43.000,00	2018	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2022
A56	DPT	IPDNA/C GVC	Aquisição de solução para utilização de smart labels (lacs inteligentes/RFID- Identificação por Radiofrequência)	1	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	2018	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2022
A58	DGI	DITEC	Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de segurança lógica de perímetro contra ataques avançados que utilizam malware avançado, exploração do dia zero, e táticas de APT, com Transferência de conhecimento, suporte técnico e manutenções por 60 (sessenta) meses	2	R\$ 800.000,00	R\$ -	2018	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2022
A60	DGI	DITEC	Aquisição de switches de acesso 48 portas PoE para alocação nas unidades em construção/reforma e para substituição dos equipamentos sem garantia que apresentarem problema	111	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	2018	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



AÇÕES TRANSFERIDAS PARA O PRÓXIMO PDTIC NA PRIMEIRA REVISÃO DO PDTIC 2017 a 2019

ID	Departamento	Responsável	Ação	Qtd	Previsão Investimento Total	Previsão Custeio Total	Previsão Inicial	Motivo da Transferência
A61	DGI	DIPO	Aquisição de Solução de Análise de Redes Sociais, Busca de informações e indexação (ORBIT)	1	R\$ 1.580.000,00	R\$ -	2018	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2024
A66	DGI	DITEC	Contratação de serviços de digitalização de documentos para digitalizar o legado da Polícia Civil e disponibilizá-lo em sistema de virtualização de documentos	1	R\$ -	R\$ 560.000,00	2018	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023
A67	DGI	DIPO	Sistema de Controle de Veículos aéreos não tripulados - VANTS (DRONES). Esse sistema deverá ser desenvolvido com finalidade de controlar essas aeronaves de baixo custo, possibilitando a realização de operações de investigativas, de monitoramento, de mapeamento e apoio a operações estratégicas	1	R\$ 100.000,00	R\$ -	2018	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023
A68	DGI	DATE	Contratação de Cursos na área de Geotecnologia aplicada à Análise Urbana	1	R\$ -	R\$ 4.000,00	2018	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2024
A69	DGI	DIPO	Aquisição de SOFTWARE SQL NAVIGATOR QUEST	2	R\$ 20.000,00	R\$ -	2018	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2022
A70	DGI	DITEC	Solução de Segurança composta por CFTV e biometria para controle de acesso às instalações das Unidades da PCDF	1	R\$ 7.000.000,00	R\$ -	2019	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2022
A74	DGI	DITEC	Aquisição de software SQL DELTA especializado para comparação de dados e estruturas nos bancos de dados da PCDF	05 Unidade	R\$ 150.000,00	R\$ -	2019	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



ações transferidas para o próximo PDTIC na primeira revisão do PDTIC 2017 a 2019

ID	Departamento	Responsável	Ação	Qtd	Previsão Investimento Total	Previsão Custeio Total	Previsão Inicial	Motivo da Transferência
A75	DGI	DITEC	Aquisição de software especializado em Gestão de Contratos e contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação e treinamento na solução adquirida	1	R\$ 120.000,00	R\$ 152.000,00	2019	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023
A77	DGI	DITEC	Aquisição de licenças do Citrix XenApp + NetScaler	50 licenças	R\$ 145.000,00	R\$ -	2019	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023
A79	DGI	DITEC	Aquisição de software especializado e contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação e treinamento em gestão de processos de TIC	1	R\$ 360.000,00	R\$ 15.000,00	2019	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023
A80	DGI	DITEC	Aquisição de software e contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação e treinamento em Gestão de Projetos		R\$ 80.000,00	R\$ 300.000,00	2019	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023
A81	DGI	DITEC	Contratação de empresa para realização de atualização tecnológica da Solução Blade Cisco (Chassi, lâminas e switches de ligação) para Ambiente de Virtualização Hyper-V	1	R\$ 1.661.942,00	R\$ -	2019	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023
A86	DGI	DITEC	Aquisição de Software KeyLines Professional Edition para desenvolvimento de aplicações de visualização de rede personalizadas com suporte de 36 meses	05 licenças	R\$ 200.000,00	R\$ -	2019	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023
A91	DGI	DITEC	Contratação de Instituições de Ensino Superior, visando a capacitação profissional a nível de especialização, mestrado e doutorado	10	R\$ -	R\$ 1.050.000,00	2019	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023
A94	DGI	DIPO	Aquisição de solução de reconhecimento facial	1	R\$ 750.000,00	R\$ -	2019	Repriorizada para o PDTIC 2020 A 2023



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



6) PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO

Desta forma, após a 1ª revisão e atualização do PDTIC/PCDF 2017 a 2019, o Plano de Metas e Ações passou a conter 63 ações, diferentes da versão original do PDTIC, que contava com 98, conforme descrito na tabela a seguir.

PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
								G	U	T	TOTAL GUT			Investimento Total	Custeio Total	
1	A1	DGI	DITEC	N1	Contratação de empresa especializada para fornecimento de ampliação/atualização do Licenciamento da Solução de Backup/Restore, Desduplicação de dados, com garantia, transferência de conhecimento, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, por no mínimo 12 (doze) meses	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	5	5	5	125	dez-17	dez-17	R\$ 1.200.000,00	R\$ 900.000,00	EXECUÇÃO
	A2	DGI	DITEC	N9	Contratação de serviço de acesso à internet (links)	Aprimorar a Estrutura de Rede de Dados da PCDF	Índice de disponibilidade dos Serviços de Rede da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	5	5	5	125	dez-17	dez-17	R\$ -	R\$ 520.426,00	EXECUÇÃO
	A3	DGI	DITEC	N3	Serviço de manutenção corretiva, com aplicação de peças, extensão da garantia, para 2.500 computadores da PCDF.	Aprimorar a Infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	5	5	125	dez-17	dez-17	R\$ -	R\$ 668.325,00	EXECUÇÃO
	A4	DGI	DITEC	N3	Renovação de Garantia e Suporte técnico dos Servidores HP DL 980, por 36 meses.	Aprimorar a Infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	5	5	125	dez-17	dez-17	R\$ -	R\$ 374.693,88	EXECUÇÃO
	A5	DGI	DITEC	N12	Contratação de empresa para fornecimento de solução antivírus, com licenciamento perpétuo, válido e atualizado por 36 meses, gerência centralizada, suporte técnico on site e capacitação.	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança de rede tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança de rede	5	5	5	125	dez-17	dez-17	R\$ 152.550,00	R\$ 64.400,00	EXECUÇÃO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
								G	U	T	TOTAL GUT			Investimento Total	Custeio Total	
1	A7	DGI	DITEC	N1	Contratação de empresa para fornecimento de fitas LTO6, com etiquetas, e Drive LTO5 para solução de Backup	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	5	5	5	125	dez-17	dez-17	R\$ 147.796,67	R\$ -	EXECUÇÃO
	A10	DGI	DITEC	N12	Aquisição de Certificado Digital Padrão ICP-BRASIL para aplicação no sistema SITTEL	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança de rede tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança de rede	5	5	5	125	dez-17	dez-17	R\$ 16.420,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A12	DGI	DITEC	N12	Aquisição de Certificado SSL do tipo WildCard para o Domínio da PCDF, com validade de 36 meses.	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança de rede tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança de rede	5	5	5	125	dez-17	dez-17	R\$ 8.000,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A15	DGI	DITEC	N1	Aquisição de cofre para armazenamento e acondicionamento para fitas LTO	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	5	5	5	125	dez-17	dez-17	R\$ 120.000,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A18	DGI	DITEL	N5	Contratação de Serviços de Telefonia Móvel, local e longa Distância.	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	5	5	5	125	dez-17	dez-17	R\$ -	R\$ 5.501.054,00	EXECUÇÃO
	A6	DGI	DITEC	N2	Contratação de empresa especializada no fornecimento de 02 (dois) subsistemas de armazenamento de informações com capacidade para armazenar até 800 (oitocentos) terabytes em Alta Disponibilidade Ativo-Ativo, com Transferência de conhecimento, suporte técnico e manutenções por 60 (sessenta) meses.	Aprimorar a infraestrutura de TIC, otimizando a capacidade, integridade, disponibilidade e estrutura de armazenamento de dados	Índice de disponibilidade dos equipamentos	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ 4.385.048,06	R\$ -	EXECUÇÃO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
								G	U	T	TOTAL GUT			Investimento Total	Custeio Total	
1	A8	DPT	I.I.	N4	Desenvolver projeto para Contratação de Empresa para prestação de serviços de suporte técnico, Atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva da Solução de Biometria Digital e emissão de documentos de identificação	Modernizar o controle, armazenamento de dados, pesquisa e a emissão dos documentos de identificação	Índice de emissão de documentos; % de atendimento de pesquisas de dados biométricos e forenses	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ 23.856.691,52	R\$ 12.147.244,23	CONCLUÍDO
	A9	DGI	DITEC	N3	Renovação de Garantia e Suporte técnico da Solução Blade Cisco (Chassi, lâminas e switches de ligação)	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ -	R\$ 250.176,96	CONCLUÍDO
	A11	DGI	DITEC	N3	Contratação de solução de impressão, cópia e digitalização a fim de atender necessidades gerais e específicas das unidades policiais da PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ -	R\$ 9.036.906,11	CONCLUÍDO
	A13	DGI	DITEC	N6	Contratação de empresa para provimento de Mão de Obra técnica especializada para prestação de serviços de suporte técnico e sustentação dos sistemas corporativos e ao ambiente tecnológico da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF	Firmar contratos de acordo com a estratégia para terceirização de serviços de TIC	Índice de atendimento dos serviços prestados que atenda o ANS – Acordo de Nível de Serviço (SLA) contratado	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ -	R\$ 30.183.968,76	CONCLUÍDO
	A14	DGI	DITEL	N6	Contratação de Suporte Técnico Especializado em Telefonia e Radiocomunicação & contratação de Suporte Técnico Especializado Residente, com substituição de componentes e partes, para as Centrais Telefônicas (CPCT) Mitel/Aastra/MX-One da Polícia Civil do Distrito Federal.	Firmar contratos de acordo com a estratégia para terceirização de serviços de TIC	Índice de atendimento dos serviços prestados que atenda o ANS – Acordo de Nível de Serviço (SLA) contratado	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ 670.000,00	R\$ 2.943.203,34	ANDAMENTO
	A16	DGI	DITEL	N5	Modernização do parque tecnológico de radiocomunicação: digitalização do Sistema de Rádio (Aquisição de Infraestrutura e equipamentos Tetra e de Repetidoras Híbridas)	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ 8.329.973,08	R\$ -	ANDAMENTO
	A17	DGI	DGI	N13	Renovação da prestação de serviços técnicos especializados, modalidade conhecida como on site, através da alocação de profissionais dentro do ambiente da PCDF e ampliação/atualização de licenças QlikView	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ -	R\$ 5.130.230,03	EXECUÇÃO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
								G	U	T	TOTAL GUT			Investimento Total	Custeio Total	
1	A19	DGI	DIPO	N13	Contratação de empresa especializada para atualização de licenças IBM I2, destinadas à modernização de Ferramenta de Análise de Inteligência Policial, prestação de serviços de suporte técnico para a implementação e operação da solução e serviços de treinamento na última versão disponibilizada pelo fabricante, treinamento e prestação de serviços especializados para continuidade, reestruturação e potencialização do "Sistema Cérebro" da PCDF	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ -	R\$ 4.857.107,07	EXECUÇÃO
	A20	DGI	DITEC	N3	Aquisição de licenças de softwares de infraestrutura e desenvolvimento Microsoft	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ -	R\$ 4.956.283,54	CONCLUÍDO
	A21	DPT	IPDNA/CGCV	N8	Renovação do contrato de manutenção, atualização, treinamento e suporte do Sistema de Administração de Informações Laboratoriais, LIMS	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	5	5	5	125	dez-17	dez-19	R\$ -	R\$ 476.000,00	ANDAMENTO
	A22	DGI	DITEC	N1	Aquisição de balanceador de links / aplicações (cluster)	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ 370.000,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A24	DGI	DITEC	N13	Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de ambiente de alta disponibilidade e segurança para o CPD do site de contingência da PCDF	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação	5	5	5	125	dez-17	dez-18	R\$ 7.262.048,61	R\$ -	CONCLUÍDO
	A32	DGI	DITEC	N3	Contratação de empresa especializada para Prestação de serviço de disponibilização de ambiente de alta disponibilidade e segurança para o CPD do site principal da PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	5	5	125	dez-18	dez-19	R\$ 350.000,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A55	DGI	DITEC	N12	Aquisição de Solução de Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança para Resposta a Incidentes de Segurança da Informação - SIEM (Security Information and Event Management)	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança de rede tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança de rede	5	5	4	100	dez-18	dez-19	R\$ 2.069.547,50	R\$ -	CONCLUÍDO
	A63	DGI	DITEC	N3	Aquisição de licenças VMware em sua versão mais atualizada à época de contratação	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	5	4	100	dez-18	dez-19	R\$ 1.602.351,16	R\$ -	CONCLUÍDO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
								G	U	T	TOTAL GUT			Investimento Total	Custelo Total	
2	A33	DGI	DITEL	N5	Aquisição de equipamentos e ampliação de licença para telefonia IP do Sistema Telefônico Mitel/Aastra/MX-One (versão 5.0) da Polícia Civil do Distrito Federal	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	5	4	4	80	dez-18	dez-19	R\$ 585.016,35	R\$ -	ANDAMENTO
	A34	DGI	DIPO	N7	Renovação de suporte técnico, Atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva do sistema GUARDIÃO	Garantir o funcionamento da Solução de Interceptação e Monitoramento Telefônico de modo que atenda os requisitos de DISPONIBILIDADE; INTEGRIDADE; CONFIDENCIALIDADE e AUTENTICIDADE aos usuários da PCDF	ANS – Acordo de Nível de Serviço (SLA) contratado para a Solução de Interceptação e Monitoramento Telefônicos	5	4	4	80	dez-18	dez-19	R\$ -	R\$ 3.332.742,24	CONCLUÍDO
	A35	DPT/DAG	DPT/DAG	N8	Aquisição de softwares especialista para desenvolvimento, editoração, projetos, entre outros	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	5	4	4	80	dez-18	dez-19	R\$ 750.000,00	R\$ -	NÃO INICIADO
	A36	DGI	DITEL	N5	Contratação de Serviços de Telefonia Fixa, local e longa Distância	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF: % de	5	4	4	80	dez-18	dez-19	R\$ -	R\$ 3.520.000,00	ANDAMENTO
	A37	DGI	DITEC	N1	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Solução de Monitoramento de Performance de Aplicações (APM), com transferência de conhecimento, suporte técnico, e manutenções por no mínimo 36 (trinta e seis) meses	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	5	4	4	80	dez-18	dez-19	R\$ 400.000,00	R\$ -	ANDAMENTO
	A45	DEPATE	DCCP	N8	Contratação de Empresa especializada no Suporte e manutenção da Solução de Gestão de Presos - SPIS/SISPEN	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	5	4	4	80	dez-18	dez-19	R\$ -	R\$ 1.200.000,00	NÃO INICIADO
	A48	DGI	DITEC	N3	Aquisição de Servidores de Rede para Rack para as Unidades da PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	4	4	80	dez-18	dez-19	R\$ 2.794.765,83	R\$ -	CONCLUÍDO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS		
								G	U	T	TOTAL GUT			Investimento Total	Custeio Total			
2	A53	DPT	II	N8	Aquisição de soluções que permitam a extração de dados para aplicação em diversas áreas, tais como, telefonia, informática, veicular, para posterior análise forense e ser utilizada como meio probatório	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de diponibilidade dos sistemas	5	4	4	80	dez-18	dez-19	R\$	-	R\$ 800.000,00	CONCLUÍDO	
	A54	DGI	DITEC	N1	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de gerenciamento de desempenho de rede e aplicações, o Network Performance Monitor (NPM) da Rede Corporativa da PCDF, com transferência de conhecimento, suporte técnico, e manutenções por no mínimo 36 (trinta e seis) meses	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	5	4	4	80	dez-18	dez-19	R\$	900.000,00	R\$	-	ANDAMENTO
	A62	DGI	DITEC	N3	Aquisição de scanners, impressoras específicas e equipamentos de multimídia	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	5	4	80	dez-18	dez-19	R\$	1.500.000,00			NÃO INICIADO
	A78	DGI	DITEC	N3	Aquisição de Micro computadores para as unidades policiais, modelo desktop, processador CORE I7 - 6700K 3,6 Ghz, memória RAM 8 GB DDR4, placa de vídeo 1Gb, teclado, mouse ótico, hd 1 tera, 2 monitores 23", fonte bivolt	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	5	4	80	dez-19	dez-19	R\$	9.500.000,00	R\$	-	ANDAMENTO
	A84	DGI	DITEC	N3	Contratação de empresa especializada na solução de segurança de redes (Firewall, IPS, dentre outros), Serviços de garantia e atualização de licenças e de suporte técnico com manutenção preventiva para produtos Fortinet	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	4	5	80	dez-19	dez-19	R\$	-	R\$ 2.100.000,00		ANDAMENTO
	A26	DGI	DITEC	N3	Aquisição de maletas de ferramentas para manutenção preventiva e corretiva própria dos sistemas DITEC	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	5	4	80	dez-17	dez-19	R\$	8.168,36	R\$	-	CONCLUÍDO
	A64	DGI	DITEC	N3	Aquisição de computadores do Tipo Workstation para unidades Técnicas	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	4	4	64	dez-18	dez-19	R\$	3.000.000,00	R\$	-	ANDAMENTO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
								G	U	T	TOTAL GUT			Investimento Total	Custeio Total	
2	A65	DGI	LABLD	N8	Aquisição de SOFTWARE DELPHI XE 8	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	4	4	4	64	dez-18	dez-18	R\$ 20.000,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A72	DGI	DITEC	N3	Aquisição de Servidores de Rede para Virtualização VMWare para o Datacenter da DITEC/PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	4	4	64	dez-19	dez-19	R\$ 1.600.000,00	R\$ -	NÃO INICIADO
	A73	DGI	DITEC	N3	Aquisição de estações de trabalho iMac de 21,5 polegadas "on site"	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	4	4	64	dez-19	dez-19	R\$ 520.000,00	R\$ -	ANDAMENTO
	A76	DGI	DITEC	N12	Aquisição de Solução de Segurança da Informação para a Auditoria e Rastreabilidade no Ambiente de Domínio e Servidores de arquivo	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança de rede tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança de rede	4	4	4	64	dez-19	dez-19	R\$ 925.000,00	R\$ -	ANDAMENTO
	A85	DPT	IC	N3	Aquisição de HD's, sendo 8 DRSATA 2TB, 12 DR NL-SAS 2TB e 16 DR SATA 4TB	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	4	4	64	dez-19	dez-18	R\$ 28.623,07	R\$ -	EXECUÇÃO
	A87	DGI	LABLD	N8	Aquisição de SOFTWARE DEVEXPRESS VCL (SUBSCRIPTION)	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	4	4	4	64	dez-19	dez-18	R\$ 8.000,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A95	DPT	IC	N1	Aquisição de 30 tablets e acessórios, para atender ao Criminal DROID	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	4	4	4	64	dez-18	dez-18	R\$ 79.838,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A96	DPT	IC	N2	Aquisição de 118 dispositivos de armazenamento para atender necessidade de armazenamento de vídeo e imagem	Aprimorar a infraestrutura de TIC, otimizando a capacidade, integridade, disponibilidade e estrutura de armazenamento de dados	Índice de disponibilidade dos equipamentos	4	4	4	64	dez-18	dez-18	R\$ 224.000,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A97	DPT	IC	N1	Aquisição de dois switches, oito computadores, dois servidores e trinta e dois HD's	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	4	4	4	64	dez-18	dez-19	R\$ 104.000,00	R\$ -	CONCLUÍDO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS		
								G	U	T	TOTAL GUT			Investimento Total	Custelo Total			
3	A40	DGP	DGP	N8	Contratação de empresa para prestação dos serviços de higienização, organização, classificação, digitalização, registro de metadados dos documentos que constituem as pastas funcionais dos servidores da PCDF com transferência de tecnologia e o fornecimento, mediante sistema de registro de preços, de equipamentos para digitalização - scanners e monitores de vídeo, incluindo a prestação de garantia on site dos equipamentos pelo período de 36 (trinta e seis) meses, nas condições estabelecidas no instrumento convocatório	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de diponibilidade dos sistemas	4	4	3	48	dez-18	dez-19	R\$	- R\$	450.000,00	NÃO INICIADO	
	A42	DGI	DITEC	N12	Aquisição de Certificado Digital do Tipo A3 Token ou SmartCard com personalização para 5.800 servidores policiais	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança de rede tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança de rede	3	4	4	48	dez-18	dez-19	R\$	2.500.000,00	R\$	-	ANDAMENTO
	A98	DPT/DGP	IML/Policlínica	N8	Aquisição de solução em Tecnologia da Informação em saúde ocupacional, assistencial e pericial da Policlínica e IML/PCDF.	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de diponibilidade dos sistemas	4	4	3	48	dez-19	dez-19	R\$	3.000.000,00	R\$	-	NÃO INICIADO
	A46	DPT	IC	N8	Solução/ plataforma integrada única para automação de laudos e relatórios periciais, da gestão de informações laboratoriais, de dados científicos, dos procedimentos técnicos, dos equipamentos analíticos, do controle de estoque de consumíveis e da garantia de cadeia de custódia para os institutos da Polícia Técnica (Instituto de Criminalística, Instituto de Medicina Legal, Instituto de Identificação, Instituto de Pesquisa de DNA Forense e Central de Guarda e Custódia de Vestígios) e demais unidades da PCDF no controle de vestígios.	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de diponibilidade dos sistemas	4	4	3	48	dez-18	dez-19	R\$	3.000.000,00	R\$	-	NÃO INICIADO
	A28	DGI	DITEL	N5	Aquisição de insumos para manutenção básica em rádio e telefonia	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	3	3	4	36	dez-17	dez-19	R\$	- R\$	54.000,00	NÃO INICIADO	



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
								G	U	T	TOTAL GUT			Investimento Total	Custelo Total	
3	A57	DGI	DITEC	N11	Contratação de empresa para treinamento em Banco de Dados SQL Server e Oracle	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	3	3	4	36	dez-18	dez-19	R\$ -	R\$ 165.000,00	NÃO INICIADO
	A59	DGI	DITEC	N3	Aquisição de acessórios para os switches (Transceivers óticos, cabo stack, GbIC)	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	3	3	4	36	dez-18	dez-19	R\$ 700.000,00	R\$ -	NÃO INICIADO
4	A82	APC	DITEC	N8	Aquisição de software de gestão acadêmica, contratação de serviços de consultoria, incluindo a transferência de tecnologia	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	3	3	3	27	dez-19	dez-19	R\$ -	R\$ 2.800.000,00	NÃO INICIADO
	A83	DPE	DECRIM	N8	Aquisição de soluções que viabilizem a coleta de informações de vítimas com deficiência física, auditiva e/ou visual (software ampliador de tela, de correio braile, de conversor de texto, voz e imagem para libras, de sintetizador de voz, de tradutor braile, impressora em braile, máquinas para oitiva, dicionário libras, etc)	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	3	3	3	27	dez-19	dez-19	R\$ 80.700,00	R\$ -	NÃO INICIADO
	A88	DAG	DRM	N16	Renovação de Contratação de empresa especializada para executar serviços de Manutenções Preventiva e Corretiva, Evolutiva e Adaptativa sob demanda, Suporte Técnico com atualização de licenças e Help Desk de forma continuada para o Sistema Integrado de Gestão Automation System Inventory – ASI, contemplando os módulos de Almoxarifado, Patrimônio, Compras e Contratos	Implementar ou recursos que auxiliam a gestão patrimonial da PCDF	Percentual implementado de ações e projetos que agreguem valor à Gestão Patrimonial da PCDF	3	3	3	27	dez-19	dez-19	R\$ -	R\$ 900.000,00	NÃO INICIADO
	A89	DGPC	DGPC	N8	Contratação de empresa para fornecimento licenças do software Folio Workbench Builder e licença do software Folio Views, incluindo atualização de licença, com garantia, suporte técnico e upgrade por 48 (quarenta e oito) meses	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	3	3	3	27	dez-19	dez-19	R\$ -	R\$ 6.000,00	NÃO INICIADO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
								G	U	T	TOTAL GUT			Investimento Total	Custeio Total	
4	A90	DGI	DITEC	N1	Contratação de empresa para prestação de serviço de extensão de garantia/suporte técnico de unidade robotica (tape drive) com seis drives LTO 6.	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	3	3	3	27	dez-19	dez-19	R\$ -	R\$ 140.000,00	ANDAMENTO
	A47	DGI	DITEC	N3	Aquisição de Controlador de rede sem fio Wi-Fi para rede corporativa e de Pontos de Acesso de Rede, Access Point, Wi-Fi para as Unidades da Rede Corporativa da PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	3	3	2	18	dez-18	dez-19	R\$ 580.000,00	R\$ -	ANDAMENTO
	A71	DGI	DITEC	N9	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de telecomunicações para rede metropolitana da PCDF, utilizando tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching)	Aprimorar a Estrutura de Rede de Dados da PCDF	Índice de disponibilidade dos Serviços de Rede da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	2	3	3	18	dez-19	dez-19	R\$ -	R\$ 4.424.591,16	ANDAMENTO



5. Plano de Gestão de Pessoas

5.1. Quantitativo de pessoal de TIC na PCDF

Conforme mostra a tabela abaixo, o quantitativo de servidores e de terceirizados do quadro atual, para execução das atividades de TIC da Instituição, é o seguinte:

Unidade Policial	Quantitativo de Pessoal de TIC		
	Servidores Efetivos	Terceirizados	Total de Pessoal
Gabinete DGI	07	02	09
DITEC	39	27	66
DITEL	18	07	25
Total	64	36	100

As informações sobre os quantitativos e as competências do quadro profissional de TIC foram atualizadas nesta 1ª Revisão do PDTIC/PCDF 2017 a 2019, sendo compiladas na tabela a seguir.

DISTRIBUIÇÃO DE PROFISSIONAIS DE TIC POR ÁREA DE ATIVIDADE				
Área de atividade	ÁREAS	NUMERO SERVIDORES POLICIAIS	NUMERO TERCEIRIZADOS	Total por Setor em 2017
Desenvolvimento de aplicativos (incluindo gerenciamento decodificação, testes e projeto)	SADS SAT	7	6	13
Suporte técnico e manutenção	SSTM	3	1	4
Administração de base de dados	SPCT	1	2	3
Produção / operações	SPE	6	1	7
Redes e segurança	SRDT	6	9	15
Planejamento de Contratações de TIC	SAORC			
	SAT	5	1	6
	SDEP			
Gerenciamento de relacionamentos	SA	10	0	10



Administração de TI (por exemplo, CIO, gerentes de terceirização e gerentes financeiros de TI)	GAB	6	2	8
Atendimento (help desk)	SSTM	8	7	15
Telecomunicações Telefonia	SMITRI	5	4	9
Telecomunicações Radiocomunicação	SEME	4	2	6
Gestão e Controle de Materiais e Equipamentos de Telecomunicações	SECON	3	1	4
TOTAL		64	36	100

5.2. Necessidades de capacitação em TIC

Na tabela a seguir é listada a ação de capacitação e meta relacionadas ao PDTIC atualizadas após a 1ª Revisão do PDTIC/PCDF 2017 a 2019.

ID	Descrição da Necessidade	Meta	Ação
N11	Promoção de forma efetiva da Capacitação em TIC no âmbito da PCDF	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Contratação de empresa para treinamento em Banco de Dados SQL Server e Oracle



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



6. Plano de Investimentos e Custeio

Foi realizada a atualização do Plano de Investimentos e Custeio após a 1ª Revisão do PDTIC/PCDF 2017 a 2019, no qual não foram contabilizadas as ações excluídas do Plano de Metas e Ações, bem como aquelas transferidas para o próximo PDTIC.

Foram ainda acrescentados a este Plano os valores referentes às ações incluídas no Plano de Metas e Ações do PDTIC, conforme tabela a seguir:

PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO ATUALIZADO APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Id	Tipo de Necessidade	Descrição da Necessidade	Estimativas de gastos (em R\$)							
			Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019		
N2	Infraestrutura	Ampliação e modernização de armazenamento de dados/informações	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.609.048,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
N12	Infraestrutura	Aprimoramento da gestão da política de segurança da informação	R\$ 164.550,00	R\$ 64.400,00	R\$ 6.210,00	R\$ -	R\$ 5.500.757,50	R\$ -	R\$ -	
N1	Infraestrutura	Garantir a continuidade do negócio	R\$ 1.467.796,67	R\$ 300.000,00	R\$ 449.838,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.404.000,00	R\$ 440.000,00	R\$ -	
N9	Infraestrutura	Modernização, ampliação, atualização, adequação e padronização do serviço de Rede de Longa Distância WAN, de Rede Local LAN e Rede Local sem fio (Wireless) - WLAN	R\$ -	R\$ 1.648.338,72	R\$ -	R\$ 1.648.339,72	R\$ -	R\$ 1.648.338,72	R\$ -	
N5	Infraestrutura	Modernização, ampliação, atualização, adequação, manutenção e padronização de Sistemas de Telecomunicações	R\$ -	R\$ 2.315.854,00	R\$ -	R\$ 2.362.600,00	R\$ 8.914.989,43	R\$ 4.396.600,00	R\$ -	
N3	Infraestrutura	Modernização, ampliação, atualização, adequação, padronização e disponibilidade do parque tecnológico	R\$ -	R\$ 4.993.102,66	R\$ 378.623,07	R\$ 4.324.777,66	R\$ 21.805.285,35	R\$ 8.068.505,17	R\$ -	



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO ATUALIZADO APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Id	Tipo de Necessidade	Descrição da Necessidade	Estimativas de gastos (em R\$)							
			Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019		
N7	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Ampliação, manutenção e sustentação da solução de prestação de serviço de interceptação e monitoramento telefônicos	R\$ -	R\$ 1.066.371,12	R\$ -	R\$ 1.066.371,12	R\$ -	R\$ 1.200.000,00		
N13	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Ampliação, manutenção e sustentação de soluções relacionadas a processos de investigação e de gestão da informação institucional	R\$ -	R\$ 1.578.866,79	R\$ -	R\$ 6.632.788,69	R\$ 7.262.048,61	R\$ 1.775.681,62		
N16	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Aprimoramento da gestão patrimonial na PCDF	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ 300.000,00		
N4	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Aquisição, ampliação, manutenção e sustentação da solução de biometria digital e emissão de documentos de identificação	R\$ -	R\$ 4.672.200,00	R\$ -	R\$ 4.654.820,46	R\$ 23.856.691,52	R\$ 2.820.223,77		
N8	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Manutenção, sustentação, desenvolvimento, integração, implementação e documentação dos sistemas utilizados na PCDF	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 422.000,00	R\$ 6.830.700,00	R\$ 5.308.000,00		



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO




PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO ATUALIZADO APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Id	Tipo de Necessidade	Descrição da Necessidade	Estimativas de gastos (em R\$)							
			Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019		
N11	Capacitação	Promoção de forma efetiva da Capacitação em TIC no âmbito da PCDF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 165.000,00	
N6	Mão de Obra	Manutenção e atualização dos sistemas corporativos da PCDF e da infraestrutura de TIC, utilizando terceirização de serviços e consultoria especializada	R\$ -	R\$ 7.886.108,56	R\$ -	R\$ 7.914.665,46	R\$ 670.000,00	R\$ 17.326.398,08		
TOTAL			R\$ 1.632.346,67	R\$ 24.827.241,85	R\$ 5.471.719,13	R\$ 29.626.363,11	R\$ 76.244.472,41	R\$ 43.448.747,36		
			TOTAL GERAL						R\$ 181.250.890,53	



QUADRO RESUMO

Tipo de Necessidade	Ano	Recursos Orçamentários	
		Investimento	Custeio
Infraestrutura	2017	R\$ 1.632.346,67	R\$ 9.321.695,38
	2018	R\$ 5.443.719,13	R\$ 8.635.717,38
	2019	R\$ 37.625.032,28	R\$ 14.553.443,89
Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	2017	R\$ -	R\$ 7.619.437,91
	2018	R\$ 28.000,00	R\$ 13.075.980,27
	2019	R\$ 37.949.440,13	R\$ 11.403.905,39
Capacitação	2017	R\$ -	R\$ -
	2018	R\$ -	R\$ -
	2019	R\$ -	R\$ 165.000,00
Mão de Obra	2017	R\$ -	R\$ 7.886.108,56
	2018	R\$ -	R\$ 7.914.665,46
	2019	R\$ 670.000,00	R\$ 17.326.398,08
TOTAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS			R\$ 181.250.890,53

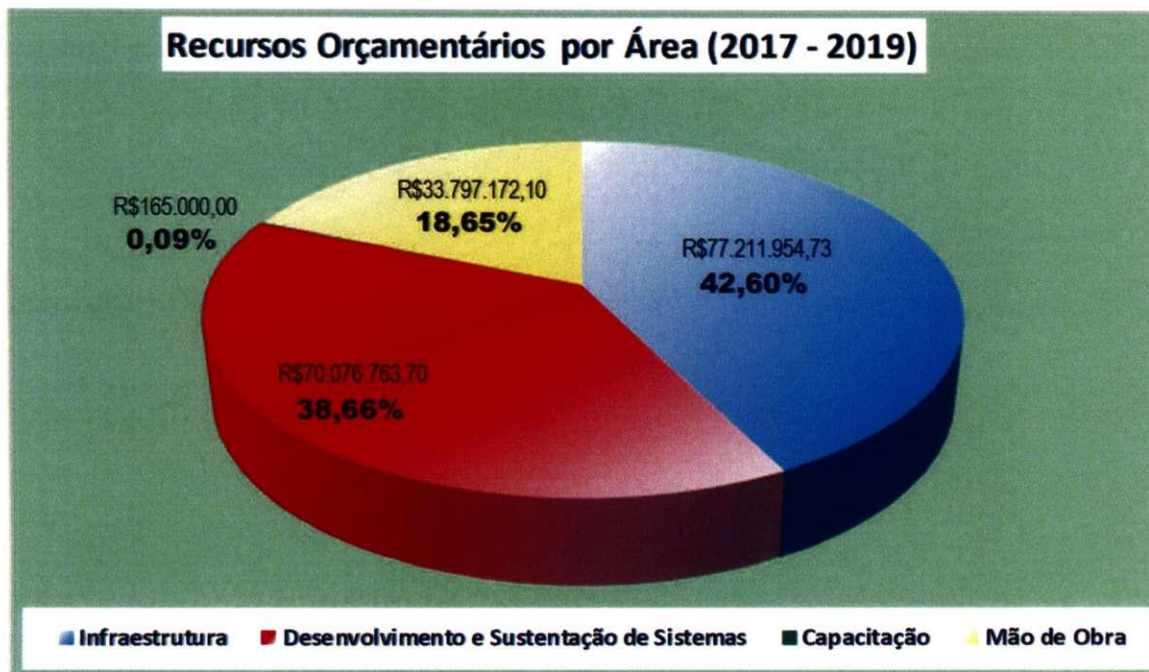




7. Proposta Orçamentária de TIC

Considerando as atualizações dos Planos de Metas e Ação e de Investimento e Custeio, é apresentada abaixo a nova proposta orçamentária para 2019.

Ano	Investimento (R\$)	Custeio (R\$)
2019	R\$ 76.244.472,41	R\$ 43.448.747,36

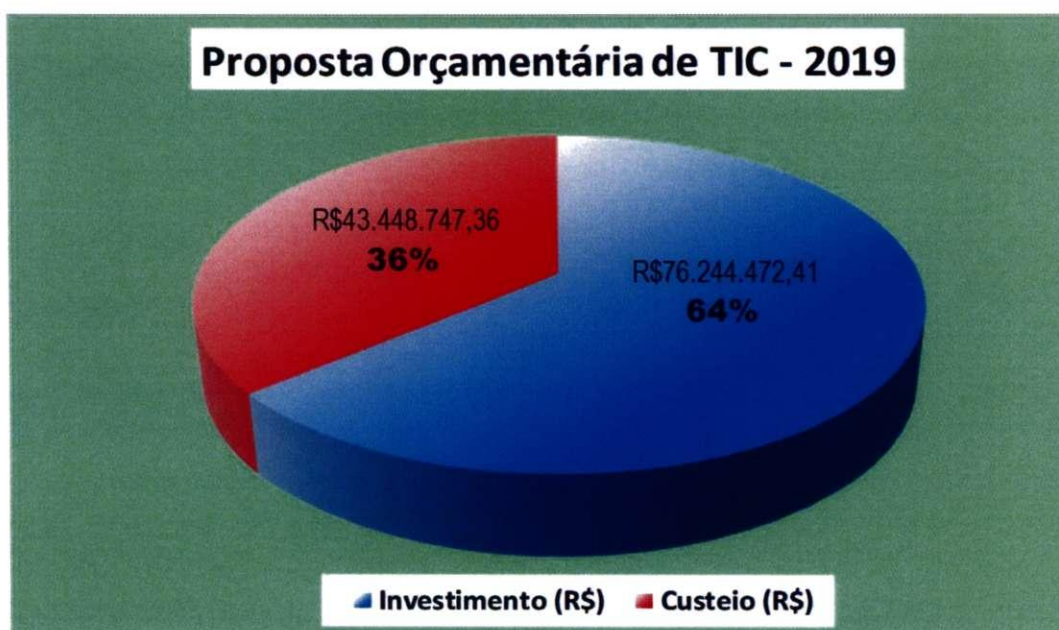




8. Aprovação


Os membros do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGTIC/PCDF aprovaram em 31 de janeiro de 2019 a 1ª Revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC/PCDF para o período de 2017 a 2019.


ROBSON CÂNDIDO DA SILVA
Diretor Geral e Presidente do CGTIC/PCDF


BENITO AUGUSTO GALIANI TIEZZI
Diretor-Geral Adjunto


ANDERSON JORGE DAMASCENO ESPINDOLA
Corregedor-Geral


SAULO RIBEIRO LOPES
Diretor do Departamento de Inteligência e Gestão da Informação
Secretário Executivo do CGTIC/PCDF


SILVERIO ANTÔNIO MOITA DE ANDRADE
Diretor do Departamento de Administração Geral


GUILHERME LORENTZ BLANCK
Diretor do Departamento de Atividades Especiais


RAIMUNDO CLEVERLAND A. MELO
Diretor do Departamento de Polícia Técnica


VICTOR DAN DE ALENCAR ALVES
Diretor do Departamento de Polícia Especializada


JEFERSON LISBOA GIMENEZ
Diretor do Departamento de Polícia Circunscrição



FERNANDO CESAR LIMA DE SOUZA
Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas

GLÁUCIA CRISTINA DA SILVA
Diretor da Academia de Polícia Civil

SÉRGIO HENRIQUE DE ARAÚJO MORAES
Chefe da Assessoria da Direção Geral
